



## X. 사통팔달 도로교통망 확충



# 대구~영천~건천~안강~포항간 광역생활 전철망 개통

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기후	국가	정상추진

## □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 대구~영천~경주~포항
- 사업기간 : 미정
- 총사업비 : (계획) 994억원(추정) / (추진) 1,181억원
  - ※ 건설비 : 국비 70% 지방비 30% ※ 운영비 : 해당 지자체에서 거리 비례 분담
  - 전동차량 구입, 통신시스템 구축 및 차량기지 건설 등
- 사업내용
  - 연 장 : (계획) 90.4km / (추진) 101.02km(전 구간 기존선 활용, 복선)
  - 운행구간 : 동대구역~하양역~영천역~아화역~서경주역~안강역~포항역
  - 노 선 도



- 사업주체 : 국토교통부, 경상북도 및 경주시
- 사업별 확인지표 : 제5차 국가철도망 구축계획 반영
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024 ~
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 중앙 권의 및 지역 여론화</li> <li>· 경북도 자체 수요분석 연구용역 추진</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제5차 국가철도망 구축계획 반영 추진</li> </ul>

□ **추진현황 : 정상추진**

- 공약진도율 (2025년 6월말 기준) : 40%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과(주요성과)**

- 2020. 3. ~ 2021. 3. : 경주시 신교통수단 도입 타당성 연구용역 시행
  - 시민설명회, 각종 보고회 개최 및 전문가 자문회의 등
- 2022. 11. : 경상북도 철도망 기본구상 연구용역 시행
- 2023. 3. : 광역전철망 구축 건의 및 업무협약(경북도, 경주시)
- 2023. 5. : 광역철도망 구축 지자체 회의(경북도, 코레일, 관련 시·군)
- 2024. 4. : 경주~울산 신교통수단 도입 타당성 조사 용역 착수
- 2024. 5. : 제5차 국가철도망 구축계획 신규사업 건의
  - ※ 23. 7. ~ 25. 4. : 제5차 국가철도망 구축계획 수립 용역(국토교통부 시행)
- 2025. 2. : 경주~울산 신교통수단 도입 타당성 조사 용역 중간보고회 개최
- 2025. 5. : 제5차 대도시권 광역교통 시행계획(대구·경북) 간담회 참석

□ **문제점 및 대책**

- 정부 상위계획 반영 등 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035년) 수립에 따라 사업시행에 상당기간이 소요될 것으로 예상됨(국토교통부 시행)
- 시설비 일부 및 운영비 관련 지자체 재원 충당에 따른 시 재정 부담 증가
- 관련 지자체별 거리 비례 사업비 분담 및 포항, 영천, 경산과의 합동 건의 사업으로 정책적 추진 필요

관련부서	주관부서	철도도심재생과	과장 박준석(2540)	팀장 오동기(2285)	담당자 이유경(2284)
	협조부서	도로과	과장 손창학(6440)	팀장 오만규(6449)	담당자 유승철(6451)

# 76-1

# 황금대교(제2금장교) 조기 건설

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시	추진상황 완료
------------	------------	-------------	-------------	------------

## □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 황성동 ~ 현곡면 라원리 일원(형산강 횡단)
- 사업기간 : 2016 ~ 2024년(9년간)
- 총사업비 : 410억원(특 10, 도 60, 시 340)
- 사업내용 : 교량건설 L=371m(B=20m), 접속도로 확장 L=1.8km,  
토지보상 1식
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보 공사추진	예산확보 공사추진	예산확보 공사완료		

## □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	36,100	20,500	7,000	5,000	3,600	0	21,960	20,500	1,430	30	0	0	
국 비	1,000	1,000					1,000	1,000					
도 비	1,000	1,000					1,000	1,000					
시 비	34,100	18,500	7,000	5,000	3,600		19,960	18,500	1,430	30			
기 타	0						0						

## □ 추진현황 : 완료

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 100%

□ 추진경과(주요성과)

- 2018. ~ 2020. : 기본 및 실시설계 용역
- 2020. : 설계경제성, 설계안전성 검토 완료 및 소규모 재해·환경 영향평가 완료
- 2020. 11. ~ 2022. 11. : 공사(1차분) 완료
- 2022. 10. : 공사착공(2차분) - 제2금장교 교량 하부공 및 상부공
- 2023. 5. : 편입토지 보상완료 및 국유재산(국가철도공단) 매수 신청
- 2023. 6. : 공사착공(3차분) - 지방도 64호선 접속도로(라원지역)
- 2023. 12. : 교량건설(폭 20m) L=371m, 강변로 접속도로 확장 완료
- 2024. 3. : 지방도 68호선 접속도로 확장 완료 및 차량통행
- 2024. 5. : 황금대교 준공식 개최

□ 현황사진



<b>관련 부서</b>	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설1팀장 오민규(6444)	담당자 이현주(6445)
------------------	------	-----	--------------	-------------------	---------------

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시	추진상황 정상추진
------------	------------	-------------	-------------	--------------

□ 공약 실천계획

- 위 치 : 경주시 통일정비 ~ 기관차 사무소 ~ 알천북로
- 사업기간 : 2005 ~ 2027년 (23년간)
- 총사업비 : (계획) 255억원(도 3.3, 시 251.7)  
(추진) 368억원(국 12, 도 3.3, 시 352.7)
- 사업내용 : 도로개설 L=1.0km(B=20-25m) 왕복4차로, 양측인도, 교량 L=200m(B=25m)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
보상협의	보상협의	보상협의	토지수용 실시설계	문화재 발굴 공사발주

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	5,589	4,289	1,000			300	5,476	4,289	1,000			187	
국 비	1,200	1,200					1,200	1,200					
도 비	330	330					330	330					
시 비	4,059	2,759	1,000			300	3,946	2,759	1,000			187	
기 타													

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 40%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2004. 10. : 지방재정투자심사 완료
- 2021. 12. : 도로확장 완료(통일정비~신홍장미APT) L=490m
- 2023. 12. : 보상협의[토지 23필지(3,999㎡), 지장물 12건]
  - 토 지 : 47필지(7,738㎡) 중 23필지(3,999㎡) 완료 **보상율 49%**
  - 지장물 : 17건 중 12건 완료
- 2024. 8. : 지장물(가옥) 철거공사

□ 향후계획

- 2025. 5. : 편입토지 보상협의
- 2025. 7. : 매장유산 현상변경 허가

□ 문제점 및 대책

- 양정로 개설 및 양정교(가칭) 개설에 대규모 예산이 필요함에 따라 단기간에 예산편성에 재정상 어려움이 있을 것으로 판단됨.

□ 현황사진



<b>관련 부서</b>	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설1팀장 오민규(6444)	담당자 김명재(6446)
------------------	------	-----	--------------	-------------------	---------------

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시	추진상황 정상추진
------------	------------	-------------	-------------	--------------

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 팔우정 삼거리 ~ 분황로
- 사업기간 : 2019 ~ 2026년(8년간)
- 총사업비 : 120억원(전액시비)
- 사업내용 : 도시계획도로 개설 L=440m, B=25m, 왕복4차로, 양측인도
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
보상협의	보상협의	보상협의	보상협의 문화재 시(발굴)조사 실시설계용역	공사발주 및 준공

### □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	7,720	5,020	2,000			700	7,021	5,020	2,000			1	
국 비													
도 비													
시 비	7,720	5,020	2,000			700	7,021	5,020	2,000			1	
기 타													

### □ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 30%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2018. 10. : 지방재정투자심사 조건부 완료
- 2023. 12. : 보상협의 및 지장물 철거
  - 토 지 : 39필지(9,815㎡) 중 31필지(7,885㎡) 보상완료 **보상율 80%**
  - 지장물 : 12건 중 6건 보상완료
- 2024. 2. : 매장유산 분과위원회 위원장 자문[2회]
- 2024. 6. : 국가유산청 신라왕경추진단 사전협의[3회]
- 2024. 8. : 문화유산 관련 전문가(4인) 자문[2회]
- 2024. 9. : 문화유산 현상변경 허가(원안가결)
- 2024. 9. : 매장유산 시굴조사 완료
- 2024. 12. : 매장유산 정밀발굴조사 착수

□ 향후계획

- 2025. 12. : 토지수용 재결 신청
- 2026. 3 ~ 12. : 도로개설공사 완료

□ 문제점 및 대책

- 2023년 문화재 현상변경 심의 시 사업추진이 부결된 바 있었으나 도로개설사업의 목적과 추진방안에 대한 충분한 업무 공감대를 형성하고 문화유산(남고루) 보존대책 제시로 2024년 문화재 현상변경 원안가결을 이끌어내는 성과를 달성하였음.

□ 현황사진



<b>관련부서</b>	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설1팀장 오민규(6444)	담당자 김명재(6446)
-------------	------	-----	--------------	-------------------	---------------

# 76-4

# 화랑초~경주고 도시계획도로 확장

<b>신규여부</b> 계속	<b>예산구분</b> 예산	<b>완료시기</b> 임기내	<b>사업주체</b> 경주시	<b>추진상황</b> 정상추진
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------------

## □ 공약 실천계획

- 위 치 : 황오동 통일정비 사거리 ~ 화랑초등학교 사거리
- 사업기간 : 2019 ~ 2027년(9년간)
- 총사업비 : (계획) 70억원 (추진) 95억원(전액시비)
- 사업내용 : 도시계획도로 확장 L=600m, B=20m, 왕복4차로, 편측인도
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
보상협의	보상협의	보상협의	기본설계 시행	토지수용 문화재 조사 착공

## □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	1,813	400	800	563		50	1,763	400	800	563			
국 비													
도 비													
시 비	1,813	400	800	563		50	1,763	400	800	563			
기 타													

## □ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 20%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2018. 10. : 지방재정투자심사 완료
- 2024. 12. : 편입용지 보상(5필지, 924㎡)
  - 토 지 : 33필지(5,911㎡) 중 5필지(924㎡) 보상완료 **보상율 15%**
  - 지장물 : 28건 중 2건 보상완료
- 2025. 2. : 기본설계용역 실시

□ 향후계획

- 2025. 7. : 편입용지 보상 협의
- 2025. 9. : 문화유산 현상변경 허가

□ 문제점 및 대책

- 편입용지 및 지장물 소유자의 보상단가 불만족으로 보상협의 지연
  - 이해관계인의 보상협의 적극 독려 및 사업효과 설명 안내

□ 현황사진

위치도	현장사진/계획도

<b>관련 부서</b>	<b>주관부서</b>	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설1팀장 오민규(6444)	담당자 김명재(6446)

<b>신규여부</b> 계속	<b>예산구분</b> 예산	<b>완료시기</b> 임기내	<b>사업주체</b> 경주시	<b>추진상황</b> 이행후 계속추진
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

**공약 실천계획**

- 위 치 : 경주시 안강읍 근계리, 산대리 일원  
(안강문화원 앞 ~ 산대삼거리 일원)
- 사업기간 : 2000 ~ 2026년(27년간)
- 총사업비 : (계획) 200억원(도 15, 시 185) / (추진) 266억원(도 15, 시 251)
- 사업내용 : (계획) 도로개설 L=2.7km, B=23.5m  
(추진) 도로개설 L=2.86km, B=25m(4차선, 양측인도), 토지보상 1식
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보 실시설계 등 용역시행	예산확보 실시설계 등 총사업비 협의	예산확보 보상협의	토지수용 일부구간 착공	공사완료

**예산확보 및 집행내역**

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	17,150	13,450	400	1,800	1,500	0	163	0	0	63	100	0	
국 비	0						0						
도 비	1,500	1,500					0						
시 비	15,650	11,950	400	1,800	1,500		163			63	100		
기 타	0						0						

**추진현황 : 이행후 계속추진**

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 40%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과(주요성과)**

- 2019. 까지 : 도로개설 L=1,660m 완료
- 2020. 까지 : 도로확장(성토) L=424m(삼흥APT~이안지안스APT)
- 2022. 11. : 실시설계·지반조사·측량조사용역 이행
- 2023. 04. : 도로 개설을 위한 1차 관계기관 협의
- 2023. 12. : 교통안전진단 이행
- 2023. 까지 : 편입토지 보상 추진(67필지, 22,964㎡ 완료)
- 2024. 01. : 1차 주민설명회 개최(안강 이안지안스 APT)
- 2024. 05. : 소규모 재해영향평가용역 완료
- 2024. 08. : 2차 주민설명회 개최(안강읍 이장협의회)
- 2024. 11. : 2차 경찰서 협의
- 2025. 03. : 토지수용절차 진행[편입토지 163필지(49,915㎡) 중 48필지(6,579㎡)]
- 2025. 04. : 실시계획인가에 따른 관련부서 및 기관 협의
- 2025. 05. : 국가유산 영향진단 용역(문화재지표조사) 이행

□ **향후계획**

- 2025. 08. : 도시계획시설변경 결정
- 2025. 12. : 편입토지 48필지(6,579㎡) 토지수용 절차 완료
- 2026. 12. : 도로개설 L=1.2km, B=25m 추진

□ **문제점 및 대책**

- 이안지안스APT 주민 도로관련(높이, 배수등) 민원 제기에 따른 안강읍 주민의견 수렴 및 관련기관(국도관리청) 협의에 따른 시간 소요

□ **현황사진**



<b>관련 부서</b>	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설1팀장 오만규(6444)	담당자 손지은(6448)
------------------	------	-----	--------------	-------------------	---------------

<b>신규여부</b> 계속	<b>예산구분</b> 예산	<b>완료시기</b> 임기내	<b>사업주체</b> 경주시	<b>추진상황</b> 이행후 계속추진
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

**공약 실천계획**

- 위 치 : 경주시 천북면 신당리(동산교) ~ 동산리 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2026년(7년간)
- 총사업비 : 95억원(시비)
- 사업내용 :
  - (계획) 도로개설 L=1.2km(B=23m), 교량 L=66m, 토지보상 1식
  - (추진) 도로개설 L=0.92km(B=23m, 왕복4차로, 편측인도), 교량 2개소, 소하천정비 L=0.4km(B=15m), 토지매입 51필지/23,450㎡
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보 실시설계 토지보상 행정절차 이행	예산확보 토지보상	예산확보 공사착공	계속공사	공사준공

**예산확보 및 집행내역**

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	12,700	1,700	3,000	1,500	3,000	3,500	3,856	2,144	300	331	548	533	
국 비	0						0						
도 비	0						0						
시 비	12,700	1700	3,000	1,500	3,000	3,500	3,856	2,144	300	331	548	533	
기 타	0						0						

**추진현황 : 이행후 계속추진**

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 45%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과(주요성과)**

- 2022. 1. : 토지보상 및 지장물 보상 추진
- 2023. 5. : 문화재 시굴조사 및 표본조사 시행
- 2023. 8. : 산지일시사용허가 이행
- 2023. 1. ~ 12. : 편입토지 보상협의 추진 및 도시계획시설 변경결정
- 2024. 4. : 경주시 일삼감사 및 실시계획인가 고시
- 2024. 7. : 동산교~면소재지간 도로확포장공사 착공(총괄발주 78억원)
- 2025. 1 ~ 9. : 별목, 임시도로, 동산1교 철거, 구조물공 및 배수공, 동산소하천 정비 등 추진

□ **향후계획**

- 2025. 9. : 도농삼거리까지 4차로 시공 완료
- 2025. 10. ~ : 동산1교 및 2교 교량설치공 등 공사 추진
- 2026. 6. : 동산교~면소재지 간 도로확포장공사 준공

□ **문제점 및 대책**

- 편입토지 보상지연에 따른 지속적인 보상협의 및 도시계획시설 변경결정

□ **현황사진**

위치도	현장사진/계획도
	

<b>관련 부서</b>	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설1팀장 오민규(6444)	담당자 이현주(6445)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기후	경상북도	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 안강읍 안강리 ~ 강동면 단구리(국지도68호선)
- 사업기간 : (계획)2020 ~ 미정 / (추진) 2020 ~ 2028
- 총사업비 : (계획)499억원(국비 439, 도비 60) / (추진)457억원(국비 266 지방비191)
- 사업내용 : 도로개량 L=7.0km(2차로 개량)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
실시설계완료 총사업비 협의	공사착공 및 토지보상	계속공사	계속공사	계속공사

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	18,974	2,885	200	4,429	6,360	5,100	13,874	2,885	200	4,429	6,360	0	
국 비	6,743	1,799	200	1,000	944	2,800	3,943	1,799	200	1,000	944	0	
도 비	12,231	1,086		3,429	5,416	2,300	9,931	1,086		3,429	5,416	0	
시 비	0						0						
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 20%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여


□ 추진경과(주요성과)

- 2016. ~ 2020. : 제4차 국토·국지도 5개년 계획 반영
- 2019. 6. : 기본 및 실시설계용역
- 2019. 12. ~ 2021. 11. : 실시설계용역 시행
- 2023. 8. : 공사 착공

□ 향후계획

- 2024. ~ 2028. : 공사 및 토지보상 연속시행
- 2028. : 공사 준공

□ 사업장 위치

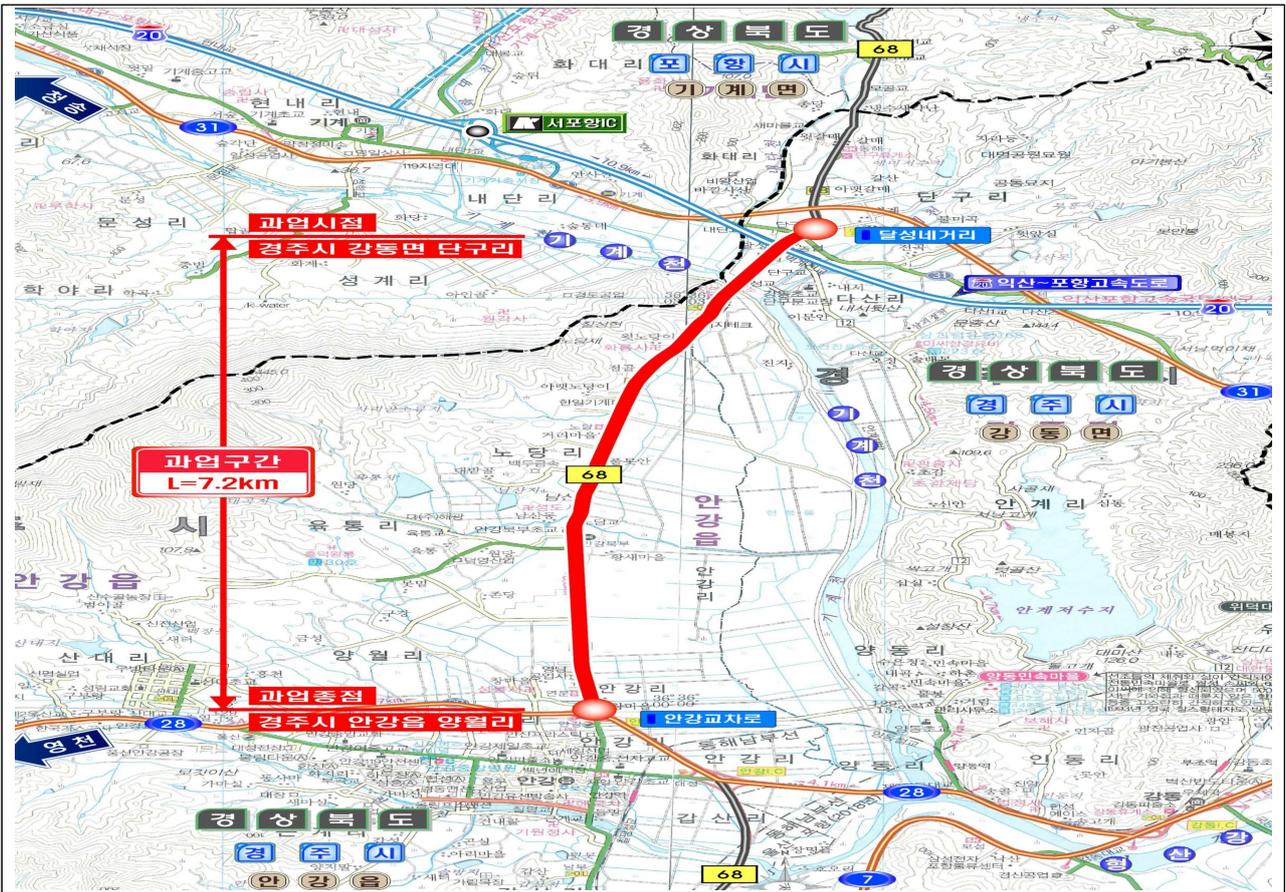

관련 부서	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설2팀장 이종호(6449)	담당자 송현정(6450)
----------	------	-----	--------------	-------------------	---------------

신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기후	사업주체 경상북도	추진상황 정상추진
------------	------------	-------------	--------------	--------------

□ 공약 실천계획

- 위 치 : 경주시 강동면 ~ 보불로 삼거리(지방도945호선)
- 사업기간 : 2018 ~ 미정
- 총사업비 : 840억원(도비)
- 사업내용 : 도로확장 L=21.0km, 4차로
  - 총21km구간 중 6.1km 타당성 확보 → 4.2km(384억원) 우선시행
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
기본 및 실시설계			설계완료, 보상 및 공사착수	

- 사업별 확인지표 : 우선시행 구간 착공

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	2,309	900	220	189	1,000	0	1,609	900	220	189	300	0	
국 비	0						0						
도 비	2,309	900	220	189	1,000		1,609	900	220	189	300		
시 비	0						0						
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 50%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2016. 8. : 왕신교 선형개량 착공 (45억원, 도비)
- 2017. 3. : 국지도 승격 및 제4차 국도·국지도건설 5개년 건의(미반영)
- 2018. 11. : 국회의원, 경상북도 방문 건의
- 2020. 2. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역(6억원)  
⇒ 총 21km 구간 중 6.1km 타당성(B/C 1.0이상) 확보 → 4.2km 우선시행
- 2020. 10. : 기본설계 착수
- 2021. 10. : 실시설계 착수
- 타당성 확보된 6.1km 구간 중 3.35km 실시설계 추진

타당성 확보 구간	사업량 (6.1km)	사업비 (억원)	비고
· 국도20호선 왕신C ~ 다이아 오토 모터브	- 2.5km(2→4차로)	300	우선시행 (3.35km)
· 동산남시터 ~ 동산삼거리	- 0.85km(4차로신설)		
· 강동면 국당리 ~ 왕신리 보건진료소	- 1.9km(2차로개량)	84	장래시행 (1.9km)

- 2022. 11. : 관계기관 협의
- 2023. 1. : 주민설명회 개최
- 2023. 9 ~ 24. 3 : 소규모재해영향평가 용역


□ 향후계획

- 2025. : 실시설계 용역 완료

□ 문제점 및 대책

- 본 사업은 국비지원을 위해 국지도 승격 후 시행하려고 하였으나 국지도 승격 후 사업추진 시 장기간 소요 될 것으로 판단되며,
- 국지도 승격 후 추진보다는 사업이 시급한 구간을 우선적으로 도비지원 받아 단계적으로 원활히 추진하고자 함

□ 사업장 위치

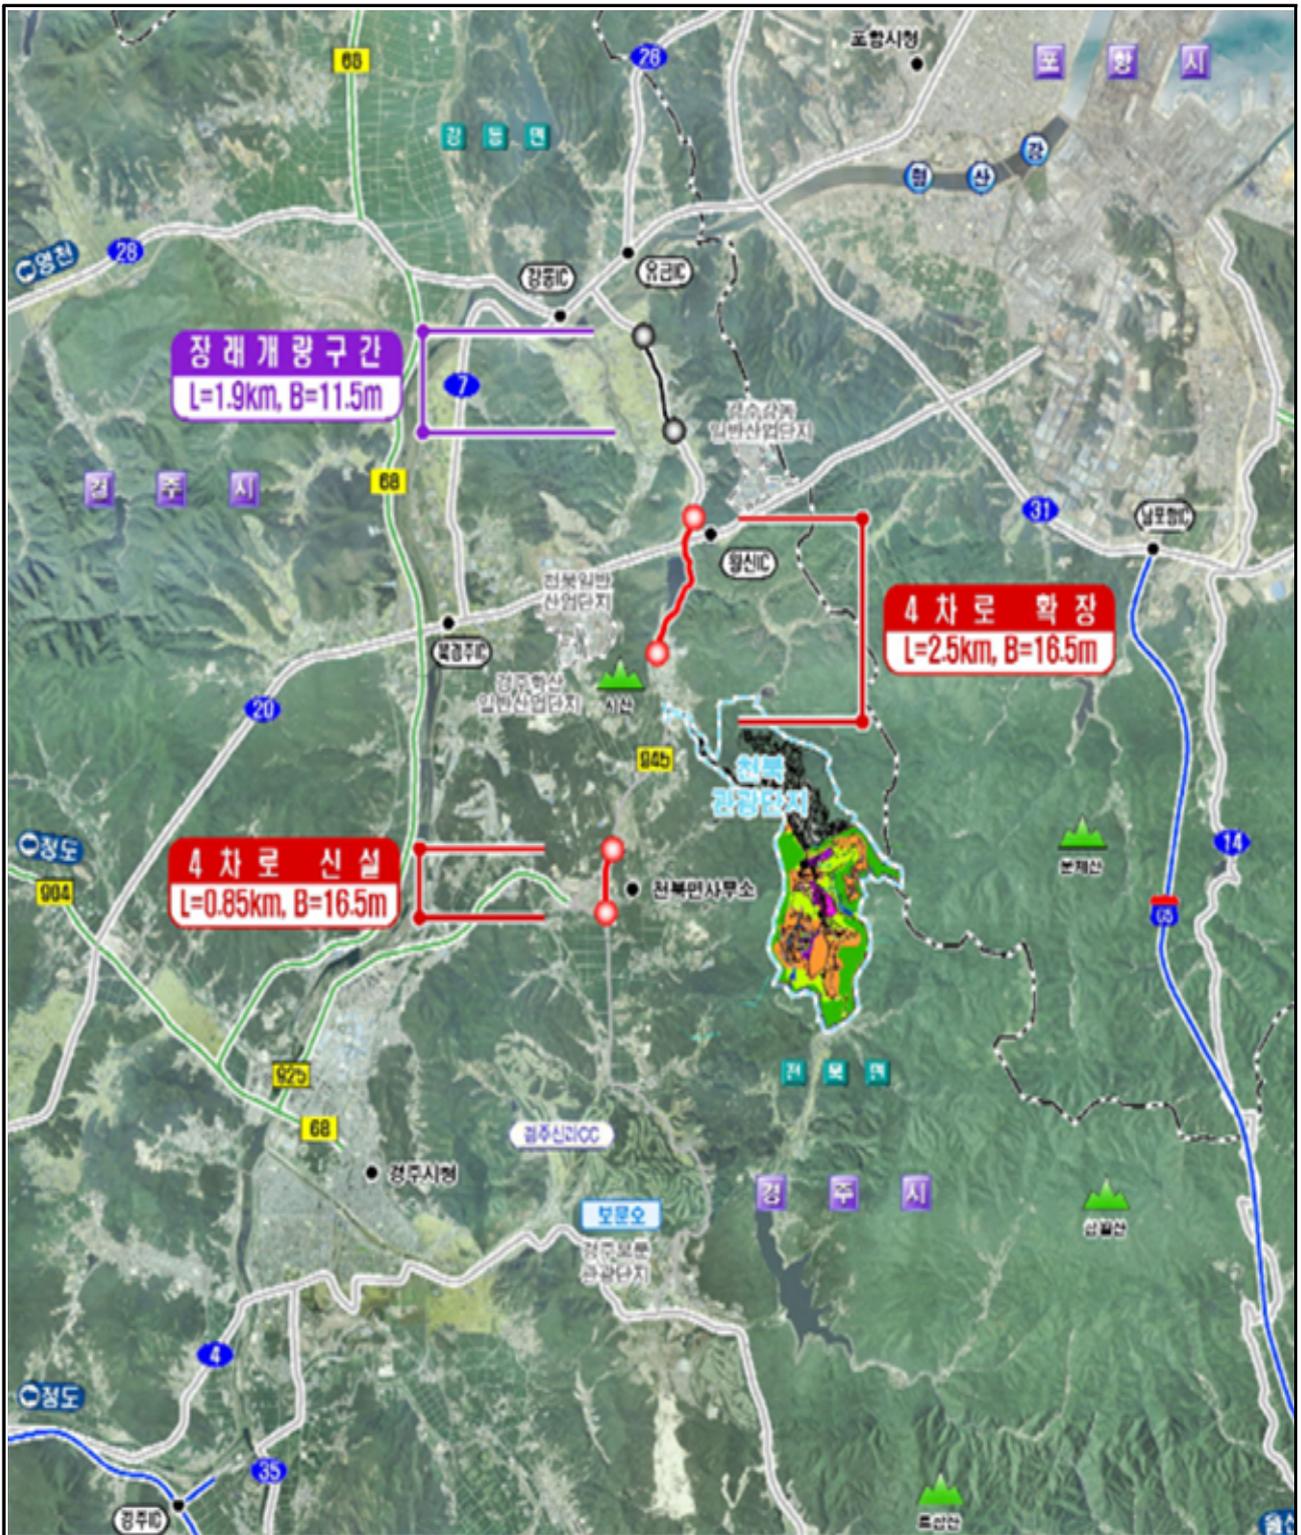

관련 부서	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설2팀장 이종호(6449)	담당자 송현정(6450)

# 78-1

## 금장 네거리~흥무로 도시계획도로 확장

<b>신규여부</b> 계속	<b>예산구분</b> 예산	<b>완료시기</b> 임기내	<b>사업주체</b> 경주시	<b>추진상황</b> 이행후 계속추진
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

### □ 공약 실천계획

- 위 치 : 경주시 현곡면 금장리 ~ 석장동 일원  
(금장네거리 ~ 동국대유치원 ~ 동대교)
- 사업기간 : 2013 ~ 2026년(14년간)
- 총사업비 : 206억원(특 8, 도 1, 시 197)
- 사업내용 : 도로개설 L=1.5km, B=20m, 왕복4차로, 편측인도, 토지보상 1식
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
실시설계 및 토지보상	행정절차 및 토지보상	도시계획시설 도로구역 결정	공사착공	공사준공

### □ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	19,000	9,000	4,300	3,000	1,700	1,000	11,150	9,000	1,473	659	0	18	
국 비	800	800					800	800					
도 비	100	100					100	100					
시 비	18,100	8,100	4,300	3,000	1,700	1,000	10,250	8,100	1,473	659		18	
기 타	0						0						

### □ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 30%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2018. 10. : 재정투자심사 완료(자체)
- 2021. 8. : 금장네거리~동국대유치원 확장개통(2→4차선, 0.6km), 도시계획 시설 변경 결정 완료
- 2021. 9. ~ : 실시계획인가 및 편입토지 보상
- 2023. 5. : 국유재산(국가철도공단) 매수 신청 및 무상사용허가 완료
- 2024. 6. : 편입토지 수용의견서 작성
- 2025. 3~ 5. : 도로구역 결정고시, 보상용역 시행, 분할측량

□ 향후계획

- 2025. 6. : 보완설계 시행, 감정평가, 보상계획 공고, 편입토지 보상협의
- 2025. ~ 2026. : 공사착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

- 편입토지 보상지연에 따른 지속적인 보상협의 및 도시계획시설 변경결정

□ 현황사진



<b>관련 부서</b>	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설1팀장 오민규(6444)	담당자 이현주(6445)
------------------	------	-----	--------------	-------------------	---------------

# 78-2

# 상구~효현 국도 대체우회도로 건설

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기내	국가	완료

## □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 효현동~현곡면 상구리 일원
- 사업기간 : 2016 ~ 2024년(9년간)
- 총사업비 : 1,805억원(국 1,411, 시 394)
- 사업내용 : 도로개설 L=6.5km(4차로), 토지보상 1식
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보 지장물이설 토지보상	예산확보 지장물이설	지장물이설 및 공사준공	-	-

## □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	163,050	120,950	26,300	15,800	0	0	122,450	120,950	1,500	0	0	0	
국 비	122,100	81,500	24,800	15,800			81,500	81,500					
도 비	0						0						
시 비	40,950	39,450	1,500	0			40,950	39,450	1,500				
기 타	0						0						

## □ 추진현황 : 완료

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 100%



신규여부 계속	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 국가	추진상황 이행후 계속추진
------------	------------	-------------	------------	------------------

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 건천읍 ~ 청도군 운문면(국도20호선)
- 사업기간 : 2014 ~ 2025년 (12년간)
- 총사업비 : (계획) 441억원(국비) / (추진) 553억원(국비)
- 사업내용 : 국도개량 L=15.66km(2차로)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
계속공사	계속공사	계속공사	공사준공	

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	55,250	9,800	11,950	10,800	10,000	12,700	41,550	9,800	11,950	10,800	9,000	0	
국 비	55,250	9,800	11,950	10,800	10,000	12,700	41,550	9,800	11,950	10,800	9,000		
도 비	0						0						
시 비	0						0						
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 90%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여


□ 추진경과(주요성과)

- 2014. 11. ~ 2018. 8. : 타당성 재검증, 기본 및 실시설계용역
- 2016. 8. : 제4차 국토·국지도 5개년 계획 반영
- 2018. 12. : 기재부 총사업비 협의
- 2019. 11. : 공사착공 및 편입토지보상

□ 향후계획

- 2025. 10. : 공사준공

□ 사업장 위치

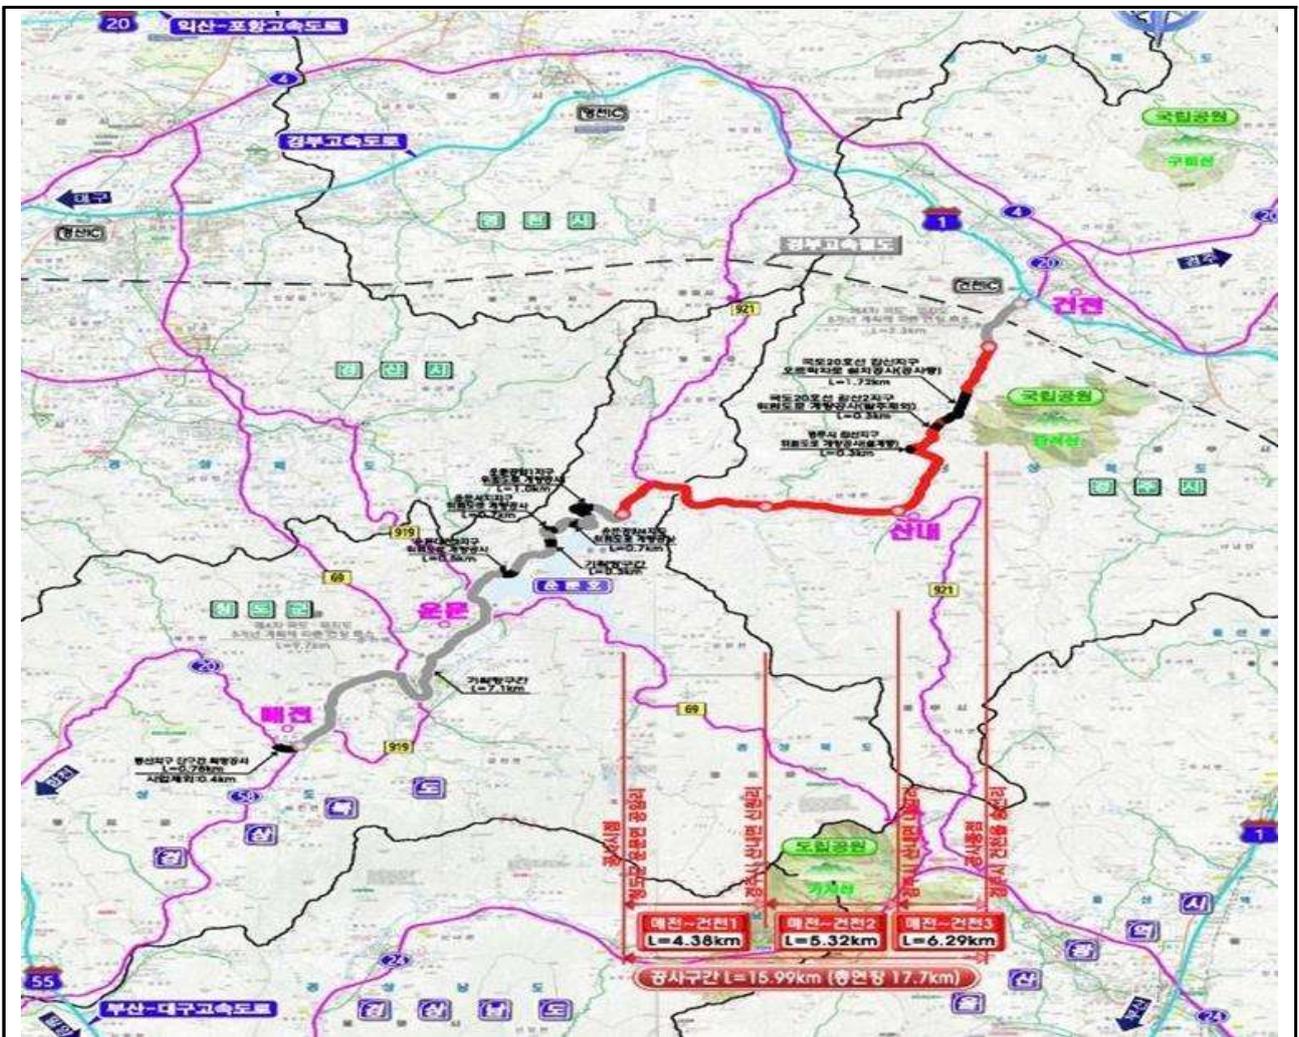

관련 부서	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설2팀장 이종호(6449)	담당자 송현정(6450)
----------	------	-----	--------------	-------------------	---------------

# 78-4

# 광명 ~ 화천(신경주역세권) 도로확장

<b>신규여부</b> 계속	<b>예산구분</b> 예산	<b>완료시기</b> 임기내	<b>사업주체</b> 경상북도	<b>추진상황</b> 이행후 계속추진
-------------------	-------------------	--------------------	---------------------	-------------------------

## □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 광명동 ~ 건천읍 화천리(지방도904호선)
- 사업기간 : 2013 ~ 2026년(14년간)
- 총사업비 : (계획) 230억원(도비) / (추진) 208억원(도비)
- 사업내용 : 도로개설 L=1.6km(4차로)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
토지보상	공사착공	계속공사	계속공사	공사준공

## □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	20,800	7,106	3,888	3,370	1,900	4,536	15,864	7,106	3,888	3,370	1,500	0	
국 비	0						0						
도 비	20,800	7,106	3,888	3,370	1,900	4,536	15,864	7,106	3,888	3,370	1,500		
시 비	0						0						
기 타	0						0						

## □ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 90%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여


□ 추진경과(주요성과)

- 2013. 7. ~ 2017. 11. : 실시설계용역
- 2019. 11. : 도로구역결정(변경) 고시
- 2020. 5. : 분할측량 및 용지보상 착수
- 2022. 10. : 용지보상 및 공사착공

□ 향후계획

- 2025. 9. : 공사준공 예정

□ 사업장 위치

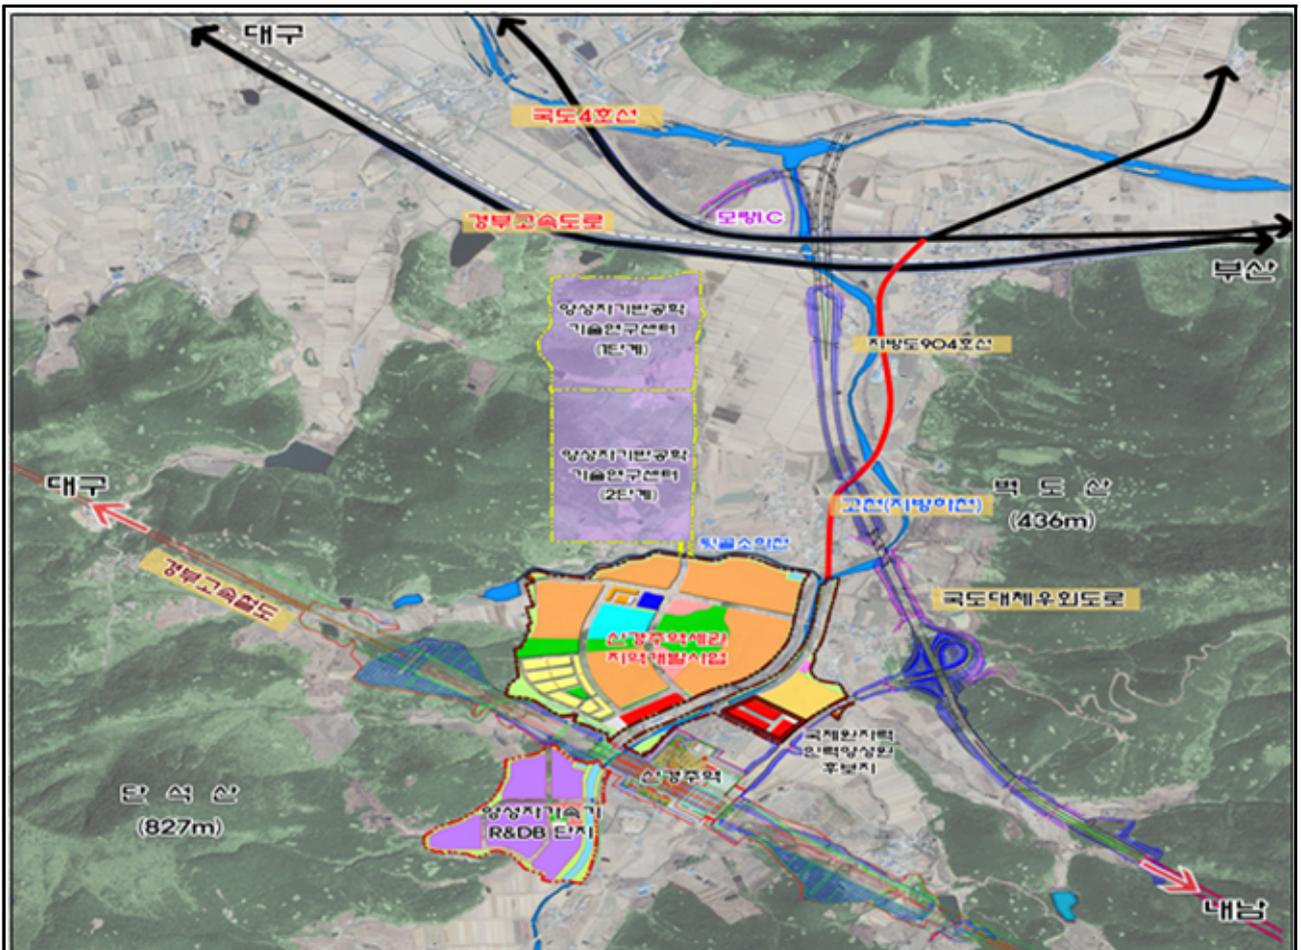

관련 부서	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설2팀장 이종호(6449)	담당자 송현정(6450)

# 78-5

# 현곡 하구~금장 도시계획도로 확장

<b>신규여부</b> 계속	<b>예산구분</b> 예산	<b>완료시기</b> 임기내	<b>사업주체</b> 경주시	<b>추진상황</b> 이행후 계속추진
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

## □ 공약 실천계획

- 위 치 : 경주시 현곡면 하구리 ~ 금장리 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2026년(7년간)
- 총사업비 : 38억원(시비)
- 사업내용 : 도로개설 L=2.2km, B=10m, 왕복2차로, 편측인도, 토지보상 1식
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
토지보상	토지보상	행정절차 및 도로개설(0.5km)	토지보상 및 공사착공(1.7km)	공사준공(1.7km)

## □ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	1,300	350	450	500	0	0	1,119	350	450	319	0	0	
국 비	0						0						
도 비	0						0						
시 비	1,300	350	450	500	0	0	1,119	350	450	319	0	0	
기 타	0						0						

## □ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 40%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2020. 12. : 실시설계 완료
- 2022. 12. : 3구간 공사 시행(L=500m)
- 2023. 4. : 공사 중지(보상지연)
- 2023. 5. : 3구간 보상협의 (26필지 중 25필지)
- 2023. 12. : 연계 용역(교통안전진단, 소규모환경영향평가 등)시행
- 2024. 4. : 3구간 보상협의 완료
- 2024. 11. : 공사 중지 해제 및 설계변경 시행
- 2024. 12. : 3구간 공사준공

□ 향후계획

- 2025. 8 : 연계용역(교통안전진단, 소규모재해영향평가 등)완료
- 2026. 3. : 1구간 공사 착공

□ 현황사진



<b>관련 부서</b>	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설1팀장 오만규(6444)	담당자 박병우(6447)
------------------	------	-----	--------------	-------------------	---------------

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기후	경주시	정상추진

□ 공약 실천계획

- 위 치 : 경주시 천군동 ~ 구정동 일원
- 사업기간 : 2015 ~ 2027년(13년간)
- 총사업비 : 400억원(시비)
- 사업내용 : 도로개설 L=3.1km, B=30m, 왕복4차로, 양측인도, 토지보상 1식
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보 실시설계 행정절차 이행 토지보상	예산확보 실시설계 행정절차 이행 토지보상	도로구역 결정 및 토지보상	예산확보 및 공사착공	예산확보 및 공사추진

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	16,400	8,900	5,000	500	1,000	1,000	12,738	8,900	2,451	1,181	206	0	
국 비	0						0						
도 비	0						0						
시 비	16,400	8,900	5,000	500	1,000	1,000	12,738	8,900	2,451	1,181	206		
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 50%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)


- 2002. 4. : 도시계획시설(도로) 결정
- 2015. 6. : 재정 투융자 심사 완료
- 2016. 8. : 문화재 표본 조사 및 협의 완료

- 2016. 11. : 기본설계 용역 완료(2억)
- 2018. ~ 2022 : 편입 부지 84필지/68,433㎡ 보상 완료
- 2023. 3. : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2024. 2. : 기본설계 완료
- 2025. 1 ~ 4. : 경관심의회, 설계VE, 소규모 환경 및 재해, 역사문화 환경영향진단조사 용역 시행

□ **향후계획**

- 2025. 6. : 경상북도 건설기술심의회
- 2025. 7. : 각종 연계용역 및 실시설계용역 완료
- 2025. ~ 2027. : 공사착공 및 준공

□ **사업장 위치**

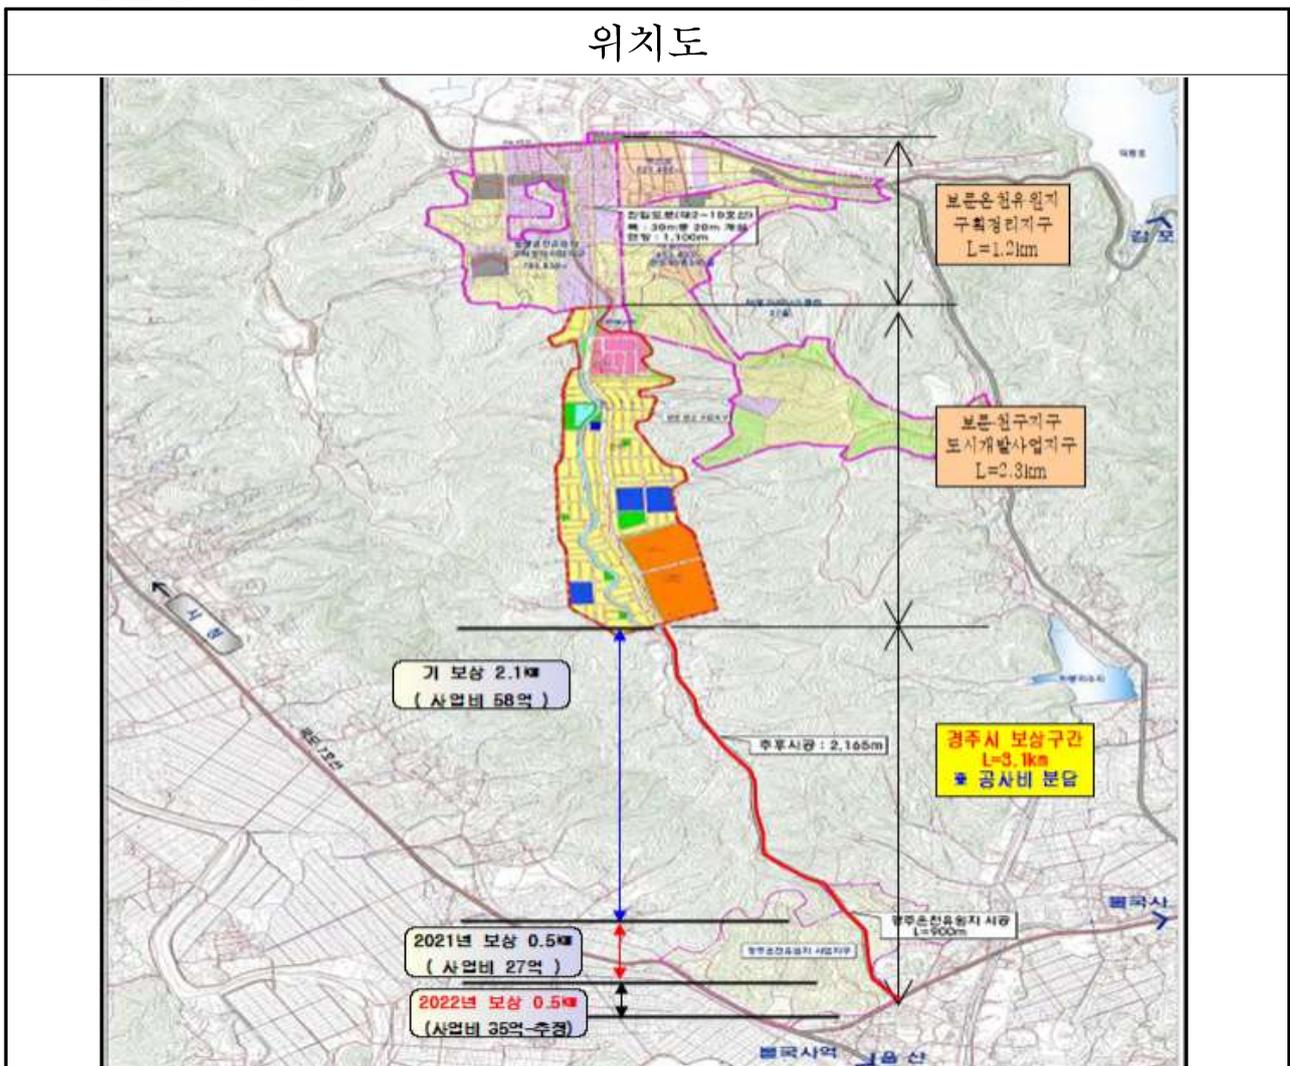

<b>관련 부서</b>	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설1팀장 오민규(6444)	담당자 이현주(6445)
------------------	------	-----	--------------	-------------------	---------------

# 79-2

# 외동 문산공단~부영APT 도시계획도로 개설

<b>신규여부</b> 계속	<b>예산구분</b> 예산	<b>완료시기</b> 임기내	<b>사업주체</b> 경주시	<b>추진상황</b> 이행후 계속추진
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------

## □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 외동읍 모화리 지내
- 사업기간 : 2018 ~ 2025 (8년간)
- 총사업비 : (계획) 70억원(특교세 6 시비 64) / (추진) 72억원(특교세 6, 시비 66)
- 사업내용 :
  - (계획) 도로개설 L=370m, B=15m
  - (추진) 도로개설 L=560m(교량 L=150m), B=15m, 왕복2차로, 양측인도
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
예산확보 토지보상	예산확보 토지보상	공사착공	공사완료	

## □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	7,200	2,200	800	3,000	0	1,200	3,165	372	319	74	2,400	0	
국 비	600	600					0						
도 비	0						0						
시 비	6,600	1,600	800	3,000		1,200	3,165	372	319	74	2,400		
기 타	0						0						

## □ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 75%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ **추진경과(주요성과)**

- 2019. 11. : 실시설계완료
- 2023. 까지 : 토지보상(12필지/7,092㎡) 완료
- 2024. 01. : 공사착공
- 2024. 02. : 주민설명회 개최(1차)
  - ※ 모화2리 일원 도로개설구간 배수관련 민원
- 2024. 05. : 외동 계동마을 배수개선 기본계획 용역 이행
- 2024. 08. : 미보상 토지(2필지/736㎡) 보상완료
- 2024. 10. : 주민설명회 개최(2차)
  - ※ 모화2리 일원 배수개선용역 결과 설명 및 의견수렴
- 2024. 12. : 일부구간 도로개설 완료 [L=410m(교량L=147m), B=15m]
- 2025. 04. : 잔여구간 실시설계 완료
- 2025. 05. : 외동 계동마을 배수개선 기본계획 용역 완료


□ **향후계획**

- 2025. 06. : 잔여구간 착공(L=150m, B=15m)
- 2025. 12. : 잔여구간 준공(L=150m, B=15m)

□ **문제점 및 대책**

- 모화2리 마을주민의 배수관련 민원 해결 요청에 따라 배수개선 기본계획 용역 결과를 설계에 반영하여 잔여구간 시공을 완료할 계획임.

□ **현황사진**

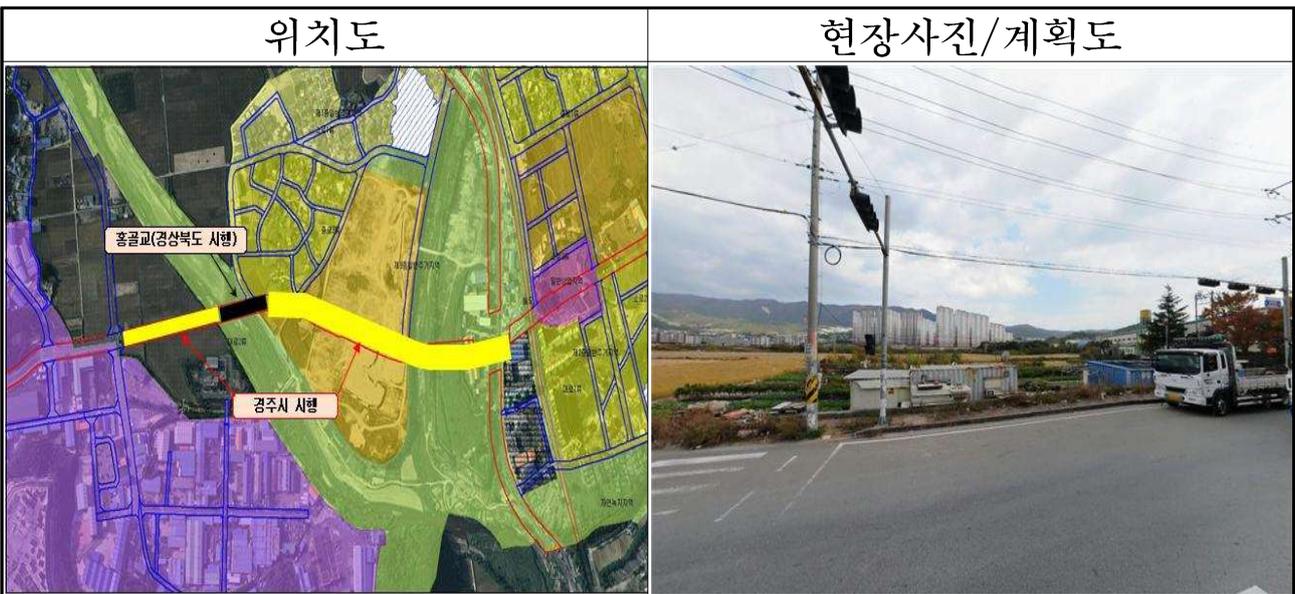

<b>관련 부서</b>	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설1팀장 오민규(6444)	담당자 손지은(6448)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기후	국가	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 외동읍 ~ 울산 북구 농소동
- 사업기간 : 2011 ~ 2028년(18년간)
- 총사업비 : (계획) 1,896억원(국비) / (추진) 1,978억원(국비)
- 사업내용 : 도로개설 L=5.9km(4차로)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
토지보상 계속공사	계속공사	계속공사	계속공사	계속공사

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	121,007	13,834	29,700	20,000	23,443	34,030	58,534	13,834	29,700	10,000	5,000	0	
국 비	121,007	13,834	29,700	20,000	23,443	34,030	58,534	13,834	29,700	10,000	5,000		
도 비	0						0						
시 비	0						0						
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 55%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여


□ 추진경과(주요성과)

- 2011. 2. 28. ~ 2012. 12. 8. : 실시설계용역
- 제4차 국토5개년계획 타당성 재검증(기본설계 1,647억→1,744억)
- 2016. 8. 12. : 기재부 타당성 재조사 결과통보(B/C=0.87, AHP=0.392)
- 2019. 1. 29. : 국가균형발전 프로젝트 예비타당성면제사업 선정
- 2019. 9. ~ 2021. 2. : 실시설계용역 완료
- 2021. 4. 12. : 공사착공 및 토지보상
- 2023. 3. : 교량 3개소 등 추진

□ 향후계획

- 2025. 이후 : 토공 및 구조물공 연속시공
- 2028. : 공사 준공

□ 사업장 위치

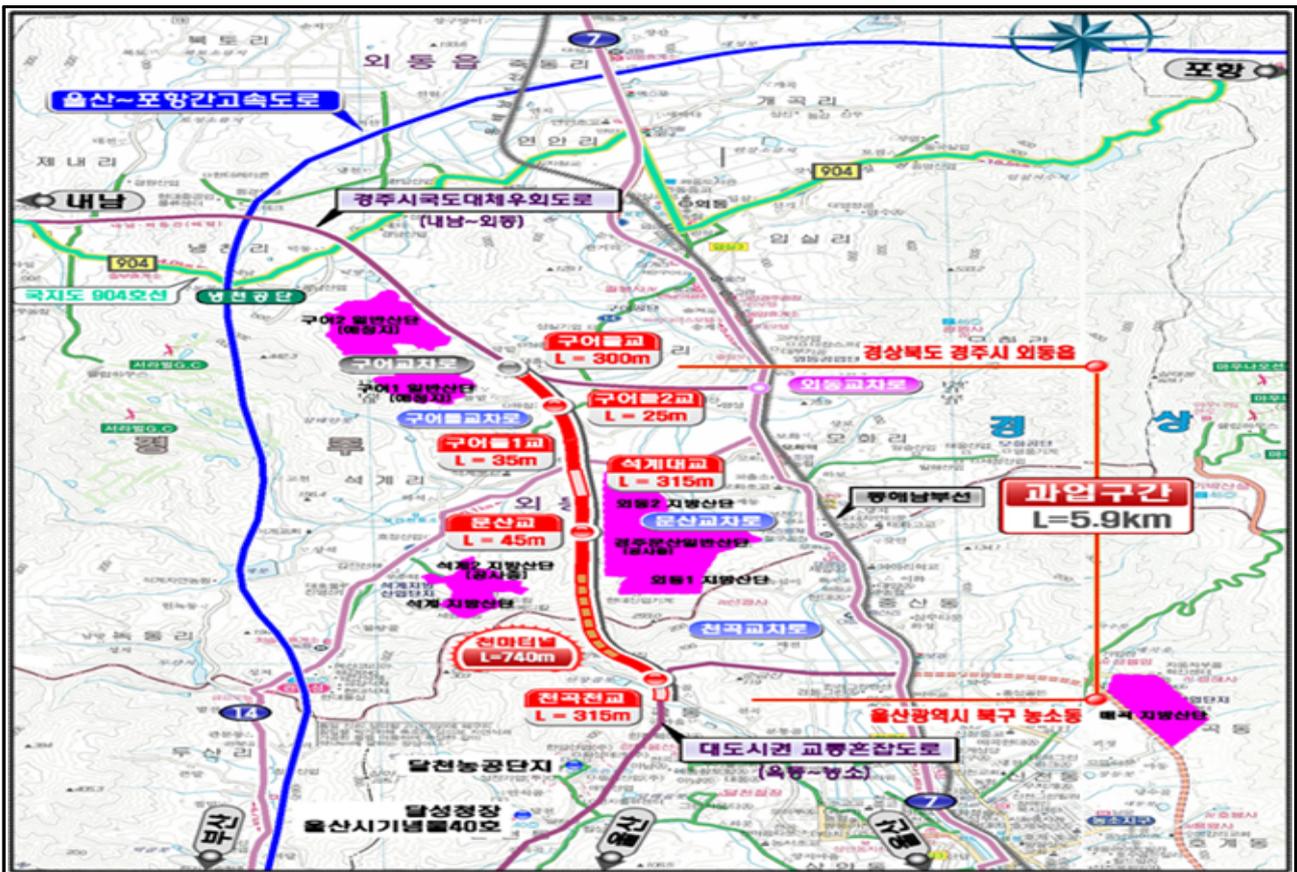

관련부서	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설2팀장 이종호(6449)	담당자 송현정(6450)

# 79-4

# 외동 녹동~문산 국도 4차로 확장

<b>신규여부</b> 신규	<b>예산구분</b> 예산	<b>완료시기</b> 임기후	<b>사업주체</b> 국가	<b>추진상황</b> 정상추진
-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------

## □ 공약 실천계획

- 위 치 : 경주시 외동읍 녹동리 ~ 문산리(국도14호선)
- 사업기간 : 2022 ~ 미정
- 총사업비 : 571억원(국비)
- 사업내용 : 국도확장 L=4.39km(4차로)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
실시설계	실시설계 총사업비 협의	실시설계 관계기관 협의	사전행정절차 및 공사착수	

## □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	24,300	0	200	1,100	1,000	22,000	1,600	0	200	1,100	300	0	
국비	24,300		200	1,100	1,000	22,000	1,600		200	1,100	300		
도비	0						0						
시비	0						0						
기타	0						0						

## □ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 55%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여


□ 추진경과(주요성과)

- 2017. 9. : 『해오름동맹 상생 협의회』 계획 사업으로 선정
- 2019. 12. 까지 : 제5차 국토·국지도 5개년 계획 반영 건의(10회)
- 2020. 12. ~ 2021. 7. : 제5차 국토·국지도 5개년 계획 일괄예비타당성 조사
- 2021. 8. 24. : 기재부 일괄예비타당성조사 결과 반영
- 2021. 9. : 국토부 도로정책심의위원회 심의·의결
- 2022. ~ : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2025. 4. : 환경영향평가(초안) 공람공고 및 주민설명회 개최

□ 향후계획

- 2025. : 실시설계용역 완료
- 2026. : 토지보상 및 공사착공

□ 사업장 위치

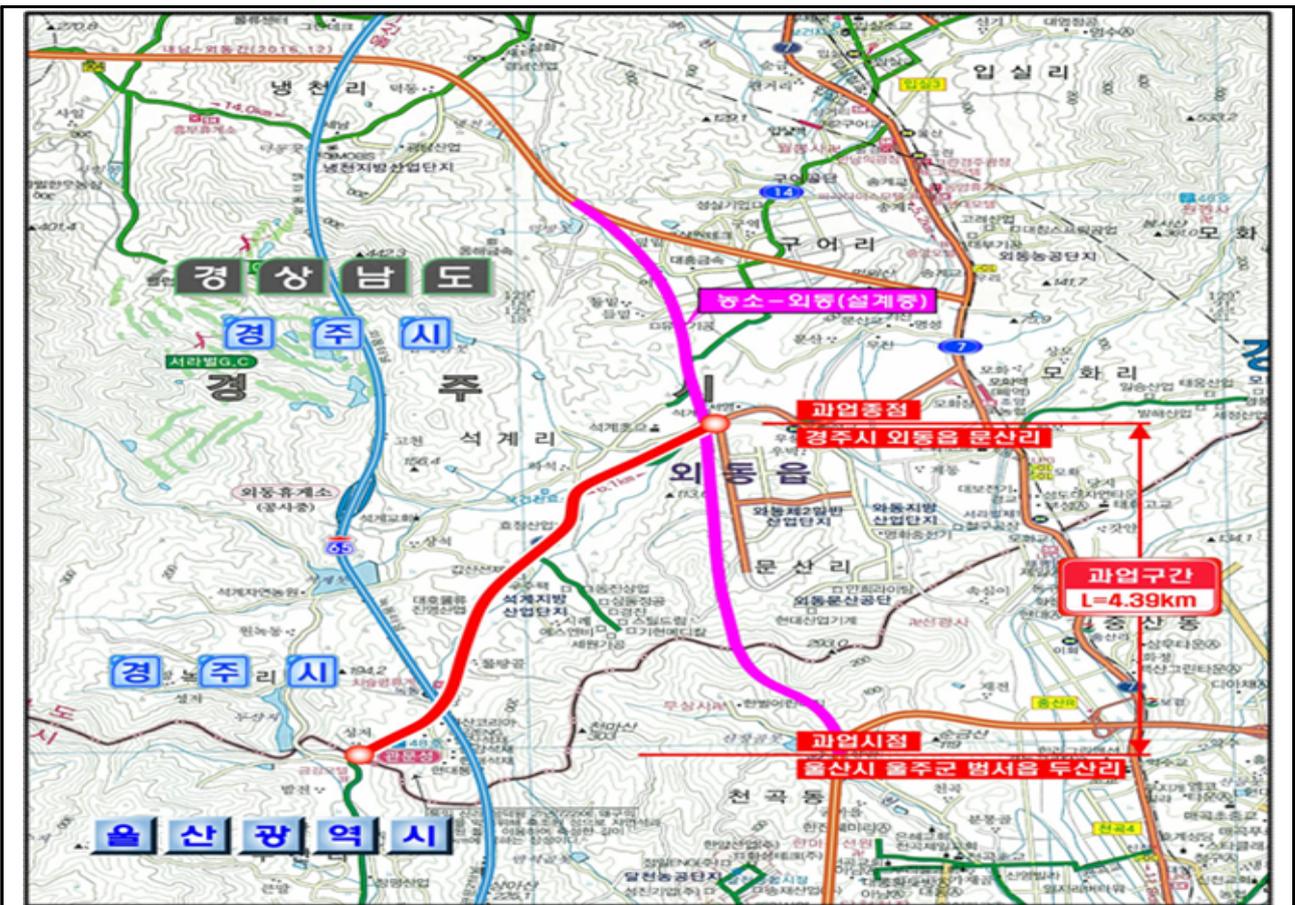

관련 부서	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설2팀장 이종호(6449)	담당자 송현정(6450)

# 79-5

# 외동~울산시계간 국도 6차로 확장

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기후	국가	정상추진

## □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 외동교차로 ~ 계동교 ~ 울산시계
- 사업기간 : 2022 ~ 미정
- 총사업비 : 150억원(국비)
- 사업내용
  - (계획) 외동교차로 ~ 계동교 국도확장 L=1.5km(4차로→6차로)
    - 계동교 ~ 울산시계 1.1km(4차로→6차로), 부영주택 공공기여 사업
  - ※ (추진) 계동교 ~ 울산시계 2.6km(4차로→6차로), 부영주택 공공기여 사업
    - 외동교차로 ~ 울산시계 국도확장 L=2.6km(6차로) 427억원 소요예상
- 사업별 확인지표 : 제6차 국도·국지도 5개년 기본계획 반영
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
	국도, 국지도 6차 5개년 계획 건의	6차 5개년 계획 반영에 따라 추진	6차 5개년 계획 반영에 따라 추진	6차 5개년 계획 반영에 따라 추진

## □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
국 비	0						0						
도 비	0						0						
시 비	0						0						
기 타	0						0						

## □ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 10%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 부


## □ 추진경과(주요성과)

- 2010. ~ 2014. : 국토부 및 부산지방국토관리청 방문 건의
- 2017. 9. : 동해남부권(울산,포항,경주) 『해오름동맹 상생협의회』  
계획사업으로 결정
- 2018. 12. : 울산 교통시민연대 7번국도 확장 촉구 기자회견
- 2019. ~ 2020. : 국토부, 국토연구원 등 방문 건의(7회)
- 2021. 4. : 국도시설개량(병목지점) 7단계 대상사업 신청(L=1.5km)
- 2022. 3. : 경주시계~울산 신답교 L=4.6km 6차로 확장 완료
- 2022. 11. : 국회, 국토교통부, 경상북도 방문 건의
- 2022. 12. : 국도병목구간 7단계(2023~2027) 미반영
- 2023. 2. : 제6차 국도·국지도 5개년 계획(2026~2030) 반영 건의  
국토교통부 사업추진 협의 방문
- 2023. 3. : 경상북도 타당성 검토용역 시행
- 2023. 5. : 부산지방국토관리청 사업추진 협의 방문
- 2023. 6. : 경상북도 사업추진 협의 방문
- 2023. 11. : 유치지역지원사업 실무협의회 시 국토부 건의
- 2025. 2. : 제6차 국도·국지도 5개년 계획(2026~2030)  
일괄예비타당성 조사 대상 선정

## □ 향후계획

- 2026. 8. : 제6차 국도·국지도 5개년 계획 반영 여부 결정
- 2026. 이후 : 제6차 국도·국지도 5개년 계획 반영여부에 따라 추진

# □ 사업장 위치

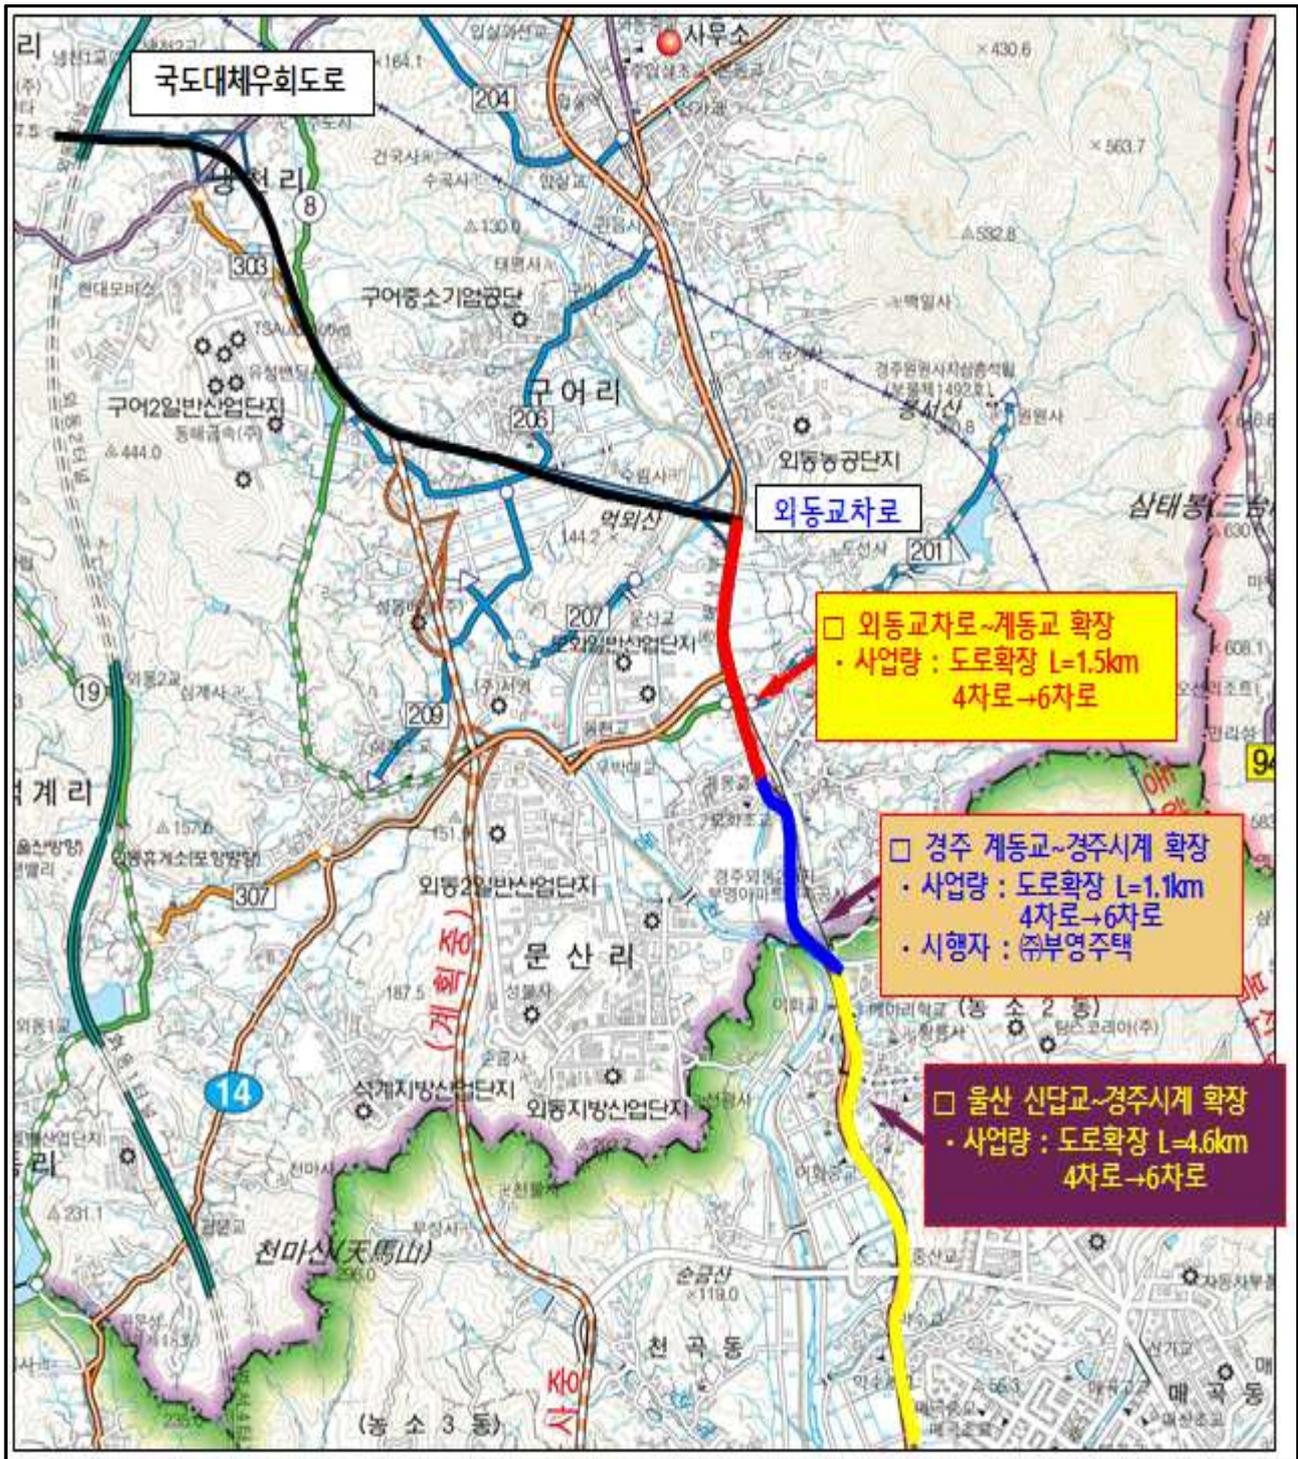

관련 부서	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설2팀장 이종호(6449)	담당자 송현정(6450)

<b>신규여부</b> 계속	<b>예산구분</b> 예산	<b>완료시기</b> 임기후	<b>사업주체</b> 경상북도	<b>추진상황</b> 이행후 계속추진
-------------------	-------------------	--------------------	---------------------	-------------------------

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 외동읍 연안리 ~ 제내리(지방도904호선)
- 사업기간 : (계획) 2017 ~ 미정 / (추진) 2017 ~ 2026년(10년간)
- 총사업비 : 300억원(국비 250, 시비 50)
- 사업내용 : 도로확장 L=4.5km(3차로)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
토지보상 공사착공	계속공사	계속공사	계속공사	계속공사

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	23,225	2,350	4,500	5,875	5,800	4,700	14,725	2,350	4,500	5,875	2,000	0	
국 비	0						0						
도 비	19,142	1,750	2,500	4,392	5,800	4,700	10,642	1,750	2,500	4,392	2,000		
시 비	4,083	600	2,000	1,483			4,083	600	2,000	1,483	0		
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 50%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여


□ 추진경과(주요성과)

- 2016. 2. : 도로확장 건의【경주시 → 경북도】 ※ 보상비 50% 경주시 부담
- 2017. 6. ~ 2019. 12. : 실시설계용역
- 2020. ~ 2022. : 각종 행정절차 이행 추진
- 2022. 7. : 토지보상 및 공사착공
  - ※ 냉천~연안구간(내남~외동 도로건설공사) : L=3.0km
- 2024. 8. : 토지보상 및 공사착공
  - ※ 냉천리구간(명계~제내간 도로건설공사) : L=1.18km

□ 향후계획

- 2026. 06. : 내남~외동 도로건설공사 공사준공 예정
- 2027. 08. : 명계~제내간 도로건설공사 공사준공 예정

□ 사업장 위치

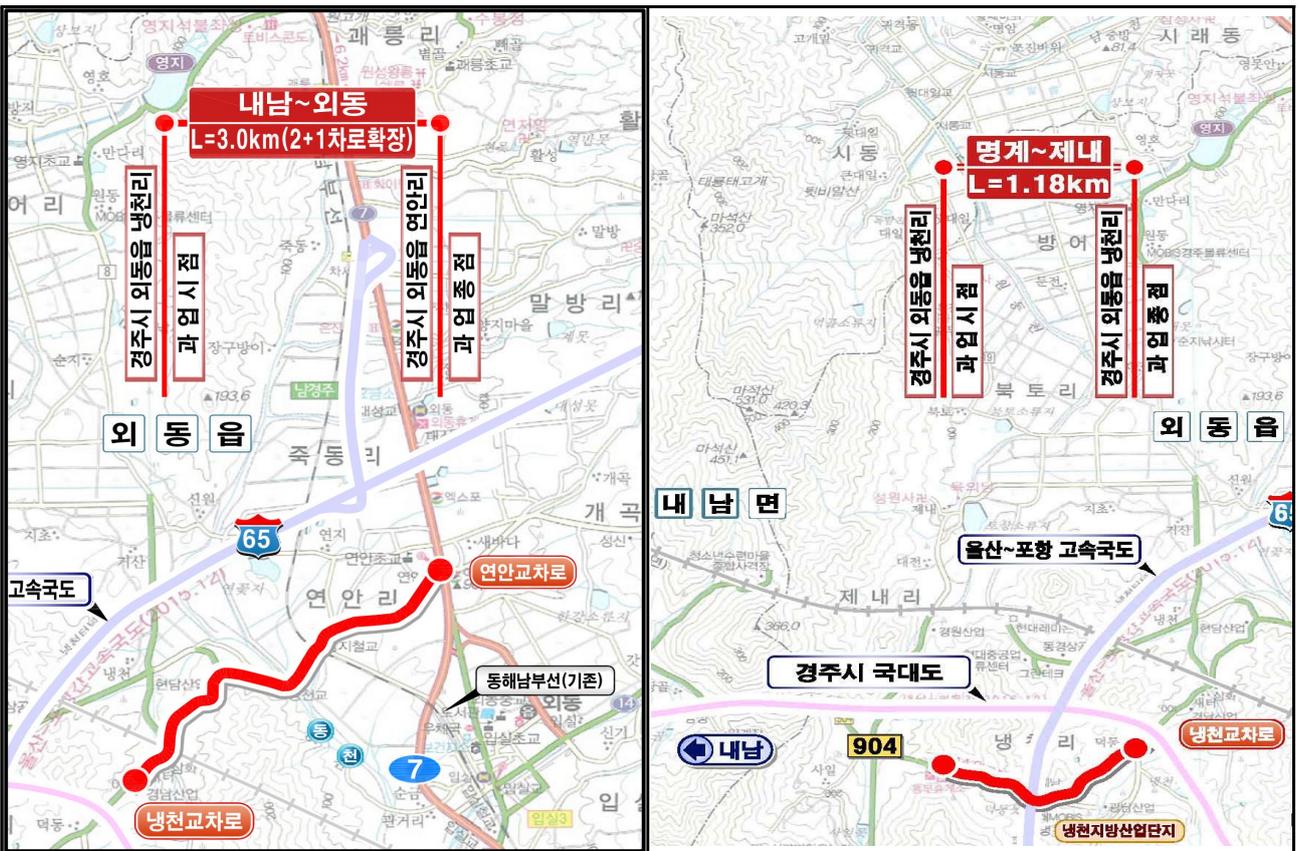

관련 부서	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설2팀장 이종호(6449)	담당자 송현정(6450)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기후	국가	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 양남면 하서리 ~ 나산리
- 사업기간 : 2017 ~ 2026 (10년간)
- 총사업비 : (계획) 686억원(국비) / (추진) 710억원(국비)
- 사업내용 : 도로개량 L=3.5km(2차로)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
토지보상 공사착공	계속공사	계속공사	계속공사	공사완료

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	49,406	3,600	13,348	12,200	13,035	7,223	39,148	3,600	13,348	12,200	10,000	0	
국 비	49,406	3,600	13,348	12,200	13,035	7,223	39,148	3,600	13,348	12,200	10,000		
도 비	0						0						
시 비	0						0						
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 60%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2006. ~ 2010. : 제2차 국도건설 5개년 계획
- 2007. 11. ~ 2010. 12. : 기본설계완료
- 제4차 국도·국지도 5개년 계획 일부반영
- 2017. 6. ~ 2019. 12. : 실시설계용역
  - ※ 노선변경에 따른 사업비 증액(120억)으로 기재부 사업계획 적정성 검토(KDI)
- 2022. 3. : 공사착공 및 편입토지보상
- 2023. 5. ~ 6. : 편입토지 수용재결신청, 보상협의회 개최

□ 향후계획

- 2026. : 3.5km구간 공사완료

□ 사업장 위치



관련부서	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설2팀장 이종호(6449)	담당자 송현정(6450)

# 80-2

# 양남~문무대왕면 국도 2차로 개량

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기후	국가	이행후 계속추진

## □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 양남면 효동리 ~ 문무대왕면 두산리(국도14호선)
- 사업기간 : 2023 ~ 미정
- 총사업비 : 669억원(국비)
- 사업내용 : 국도개량 L=7.7km(2차로)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
	실시설계	실시설계	공사착수	계속공사

## □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	1,700	0	0	400	800	500	400	0	0	400	0	0	
국 비	1,700			400	800	500	400			400			
도 비	0						0						
시 비	0						0						
기 타	0						0						

## □ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 10%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 부

□ 추진경과(주요성과)

- 2017. 9. : 『해오름동맹 상생 협의회』 계획사업으로 선정
- 2019. 12. 까지 : 제5차 국토·국지도 5개년 계획 반영 건의(10회)
- 2020. 12. ~ 2021. 7. : 제5차 국토·국지도 5개년 계획 일괄예비타당성 조사
- 2021. 8. 24. : 기재부 일괄예비타당성조사 결과 반영
- 2021. 9. : 국토부 도로정책심의위원회 심의·의결
- 2023. 5. : (부산지방국토관리청)기본 및 실시설계용역 시행
- 2025. 4. : 전략환경영향평가(초안) 공람공고 및 주민설명회 개최

□ 향후계획

- 2025년 까지 : 실시설계용역 완료

□ 사업장 위치



관련 부서	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설2팀장 이종호(6449)	담당자 송현정(6450)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기후	경상북도	이행후 계속추진

### □ 공약 실천계획

- 위 치 : 경주시 양남면 효동리 ~ 석읍리(지방도 904호선)
- 사업기간 : 2023 ~ 미정
- 총사업비 : 293억원(도비)
- 사업내용 : 도로개량 L=4.77km(2차로)
- 사업주체 : 경상북도
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024~2025	2026~2027
	도로관리청 협의	기본 및 실시설계 타당성조사 용역	보상협의 공사착수

- 사업별 확인지표 : 임기내 기반조성

### □ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
국비	0						0						
도비	1,000				1,000		0						
시비	0						0						
기타	0						0						

### □ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 20%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2023. 7. : 지방도 사업으로 타당성 검토 등 사업 건의 (시 → 경북도)
- 2023. 12 ~ 24. 12 : (경북도) 기본 및 실시설계 용역 계약


□ 향후계획

- 2025. : 실시설계 용역 완료
- 2026. : 토지보상 시행

□ 문제점 및 대책

- 「중·저준위 방사성폐기물 처분시설의 유치지역지원에 관한 특별법」에 의거 장기검토사업 변경 건의에 따른 사업추진  
⇒ 국비지원을 위해서는 국지도로 지정되어야 함
- 노선승격까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상하므로 우선 지방도사업으로 도에서 추진할 수 있도록 건의하였으며 ‘24년부터 기본 및 실시설계용역 시행

□ 사업장 위치

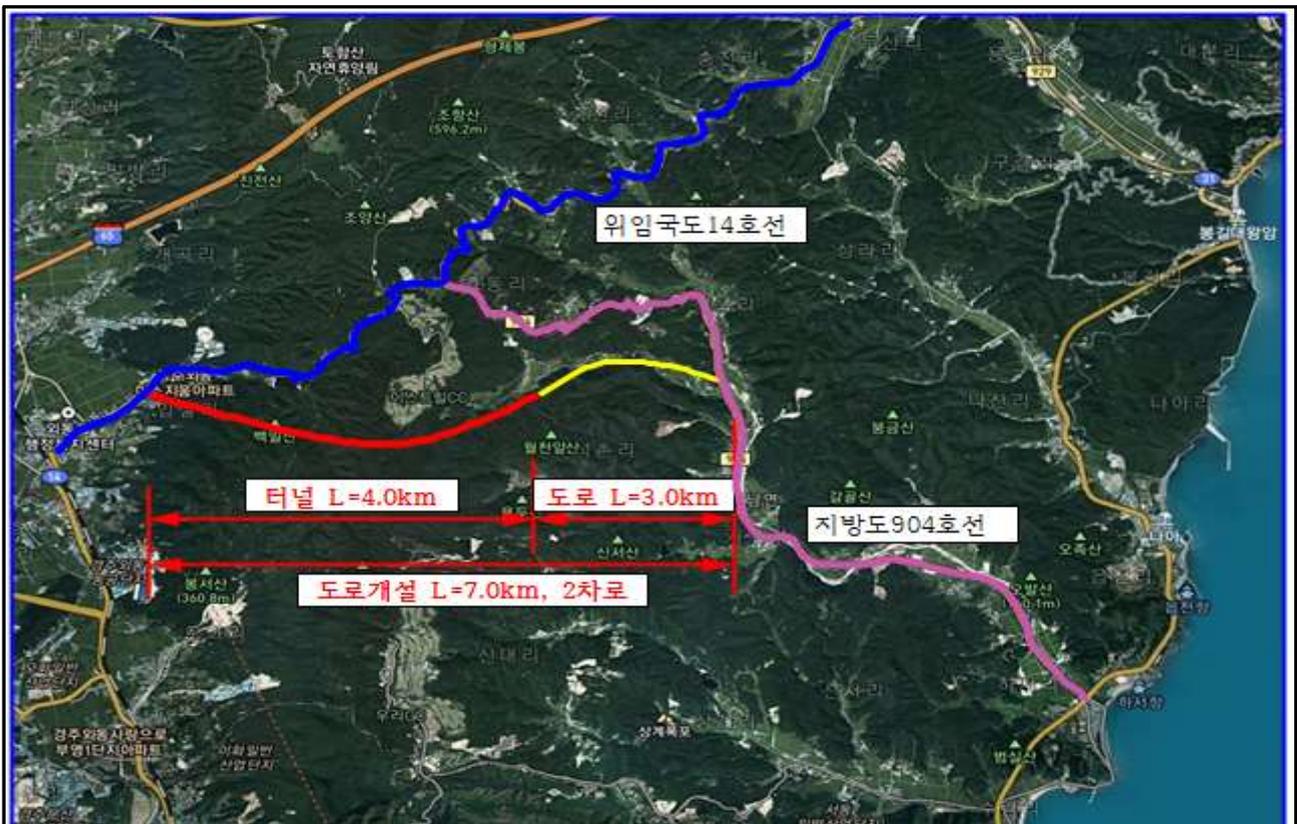

<b>관련부서</b>	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로건설2팀장 이종호(6449)	담당자 송현정(6450)
-------------	------	-----	--------------	-------------------	---------------

# 철도폐선(동해남부선, 중앙선)에 따른 도로정비

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기후	경주시	이행후 계속추진

## □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2021 ~ 2027 (7년간)
- 총사업비 : 300억원(시비)
- 사업내용
  - 철도건널목 정비 : 황성, 동천1, 동천2건널목 등 20개소
  - 지하차도 정비(평면화) : 유림, 황성1, 황성2지하차도 등 12개소
  - 과선교 정비(평면화) : 충효교, 입실과선교, 조양육교
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
· 건널목 -완료10개소 (포장 및 도로연결) · 지하차도 -실시설계 4개소 (유림, 황오, 동천, 양동)	· 건널목정비 -완료5개소(분황사, 사별2, 패릉, 대동, 구정) · 지하차도 -완료1개소(황오) -공사2개소(간천, 안강) -설계6개소(유림, 건천, 유금, 양동, 선덕, 충효) · 과선교: 기본설계 3개소(충효, 조양, 입실)	· 건널목정비 -공사 5개소 (동천1, 2, 청령등) · 지하차도 -공사 4개소 (유림, 유금, 양동, 충효) · 과선교 -실시설계 1개소 (충효, 조양, 입실)	· 지하차도 - 공사 1개소(선덕) · 과선교 - 공사 1개소(조양육교)	· 지하차도 - 공사 4개소 (배반, 황성1, 2, 동천) · 과선교 - 공사 2개소 (충효, 입실)

## □ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구분	확보액						집행액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	10,100	900	3,800	2,050	1,950	1,400	2,217	90	527	600	100	900	
국비	0						0						
도비	0						0						
시비	10,100	900	3,800	2,050	1,950	1,400	2,217	90	527	600	100	900	
기타	0						0						

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 65%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

2022	2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건널목</li> <li>-완료11개소 (포장 및 도로연결)</li> <li>• 지하차도</li> <li>-실시설계 4개소 (유림, 황오, 동천, 양동)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건널목정비</li> <li>-완료6개소(분황사, 사방2, 괴릉, 대동, 구정)</li> <li>• 지하차도</li> <li>-완료3개소 (황오, 건천, 안강)</li> <li>-유림 설계 진행중</li> <li>※하천협의중</li> <li>-유금, 양동, 선덕, 충효 설계완료</li> <li>• 과선교: 기본설계 3개소(충효, 조양, 입실)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건널목정비</li> <li>-완료2개소(황성1, 청령1)</li> <li>-공사 2개소 (황성2,3)</li> <li>• 지하차도</li> <li>-공사 5개소 (유림, 양동, 유금, 선덕)</li> <li>• 과선교</li> <li>-기본설계 6월 완료, 실시설계(충효) 발주 예정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건널목정비</li> <li>-완료1개소(황성1)</li> <li>• 지하차도</li> <li>-공사완료 1개소 (양동)</li> <li>-공사진행중 2개소 (유금, 유림)</li> <li>-공사예정 1개소 (선덕, 충효)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지하차도</li> <li>-공사 4개소 (배반, 황성1,2, 동천)</li> <li>• 과선교</li> <li>-실시설계 용역 및 공사</li> </ul>

○ 철도건널목 정비

- 2022년 : 포장 및 도로연결 완료(11개소), 건널목 사무실 철거(2개소)
- 2023년 : 분황사, 구정, 사방, 대동, 괴릉(영지) 5개소 공사 완료
- 2024년 : 청령, 황성1 사업완료
- 2025년 : 황성1 사업완료
- ※ 전체(20개소) 완료(100%)

○ 지하차도 구조개선

- 2023년 : 황오, 안강지하차도 사업완료
- 2024년 : 건천지하차도 사업완료
- 2025년 : 양동지하차도 사업완료, 유금 공사중, 유림 발주, 선덕지하차도 발주 예정

○ 과선교 구조개선

- 2023년 12월 : 과선교(3개소) 구조개선 기본계획 용역 착수
- 2024년 9월 : 과선교 구조개선 기본설계 완료

## □ 향후계획


- 지하차도 구조개선 : 연차적으로 예산확보 및 추진.
  - 2026년 : 4개소 사업추진 예정(배반, 황성1, 황성2, 동천)
- 과선교 구조개선 : 연차적으로 예산확보 및 추진.
  - 2026년 : 과선교 구조개선 실시설계 예정
  - ※ 사업비 과다로 기본설계용역 결과에 따라 우선순위(사업비, 경제성, 교통수요 및 안전성 향상 등) 검토 후 연차적 사업으로 시행 예정

## □ 문제점 및 대책

- 국가철도공단과 협의가 필요한 사업으로 폐철도 활용계획 미확정 등으로 시가지를 중심으로 하는 구간은 조기 시행이 어려움.
- 평소 도로침수 등 위험요인이 상존하는 도로와 폐철도 활용계획에 포함되지 않는 구간을 우선적으로 선정하여 사업추진.
- 지하차도 및 과선교 정비는 많은 예산이 소요되므로 폐철도활용 계획, 시급성, 재정여건을 감안하여 연차적으로 시행.

관련 부서	주관부서	도로과	과장 김철우(6440)	도로구조물팀장 권상돈(2964)	담당자 배무한(6456)

## 위 치 도(시가지)

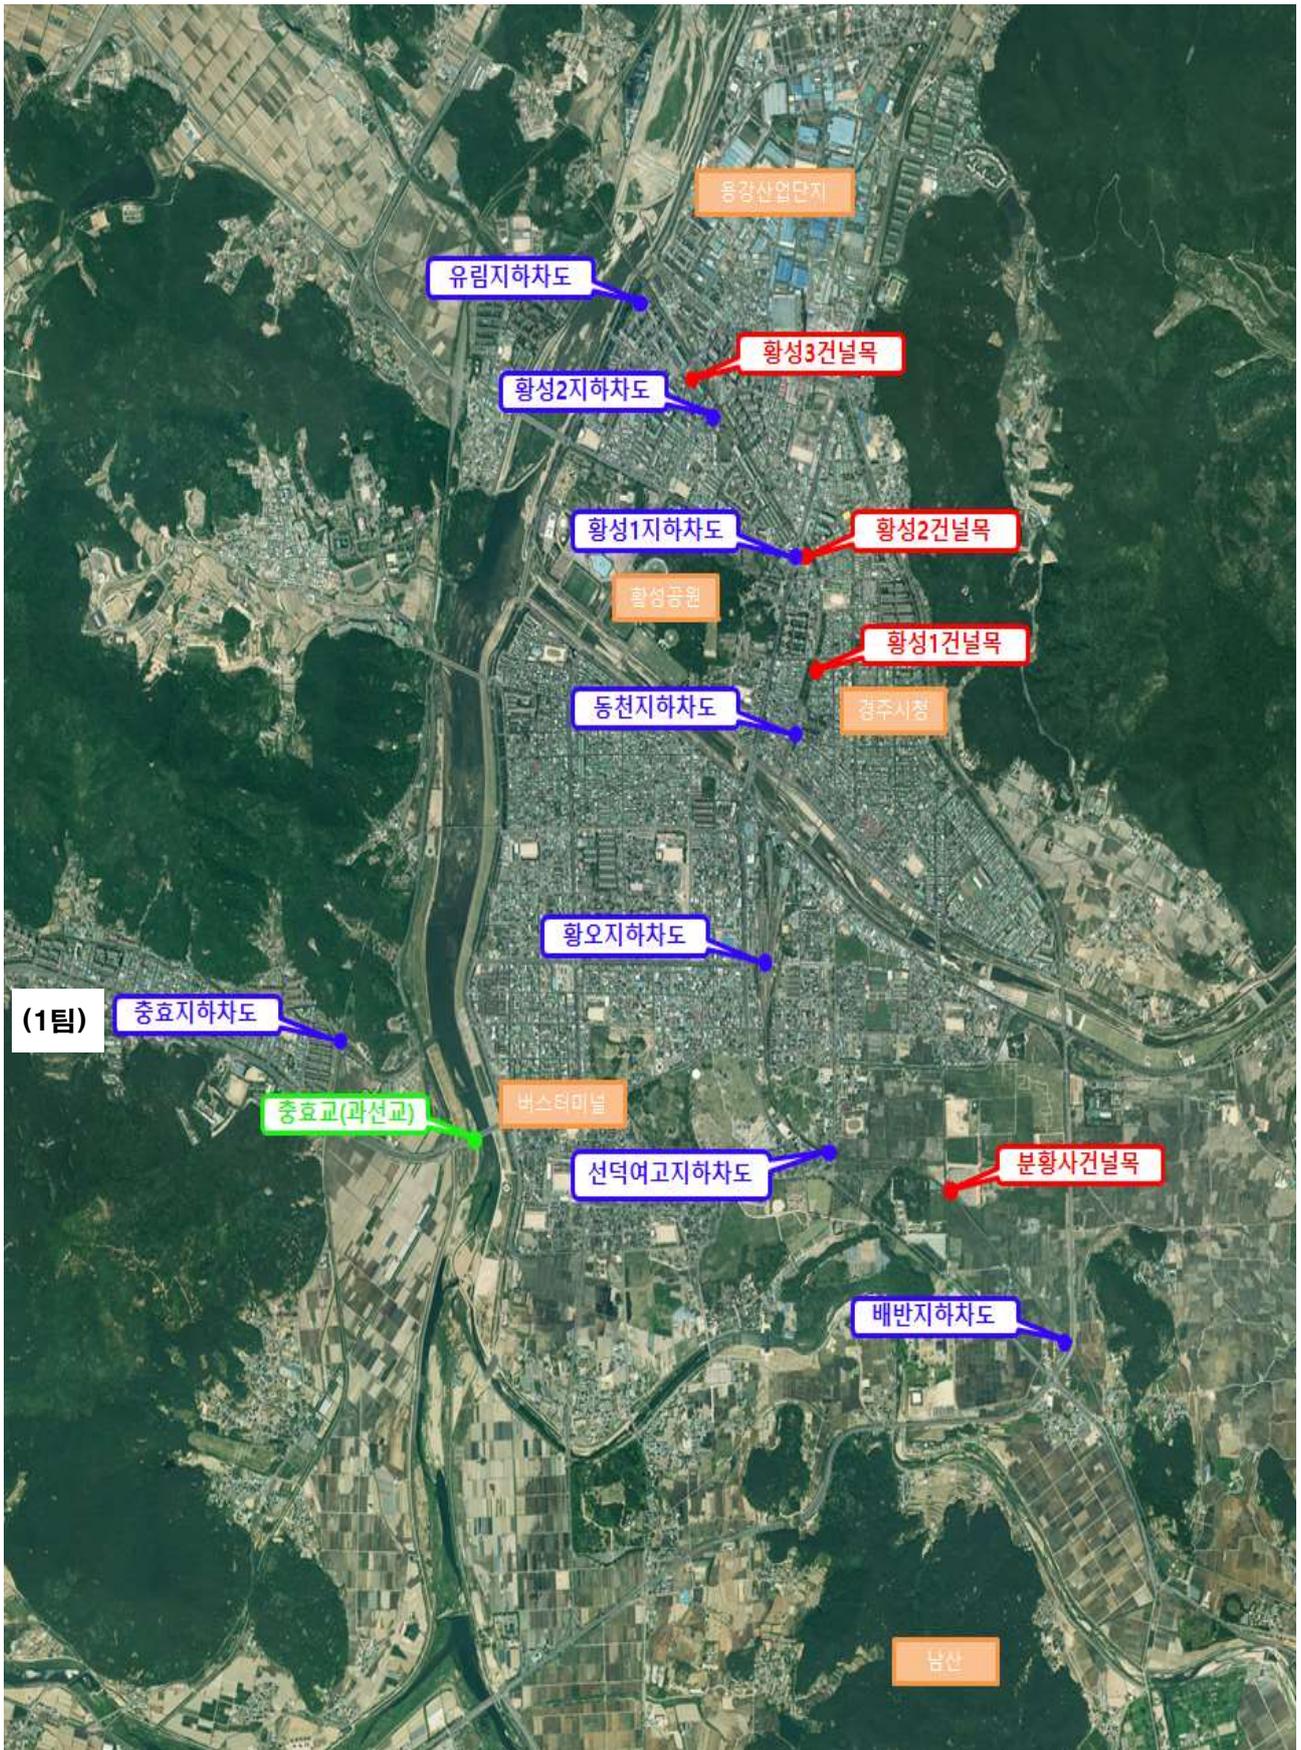


## 위 치 도(건천지역)



## 위 치 도(안강 & 강동지역)



## 위 치 도(외동지역)

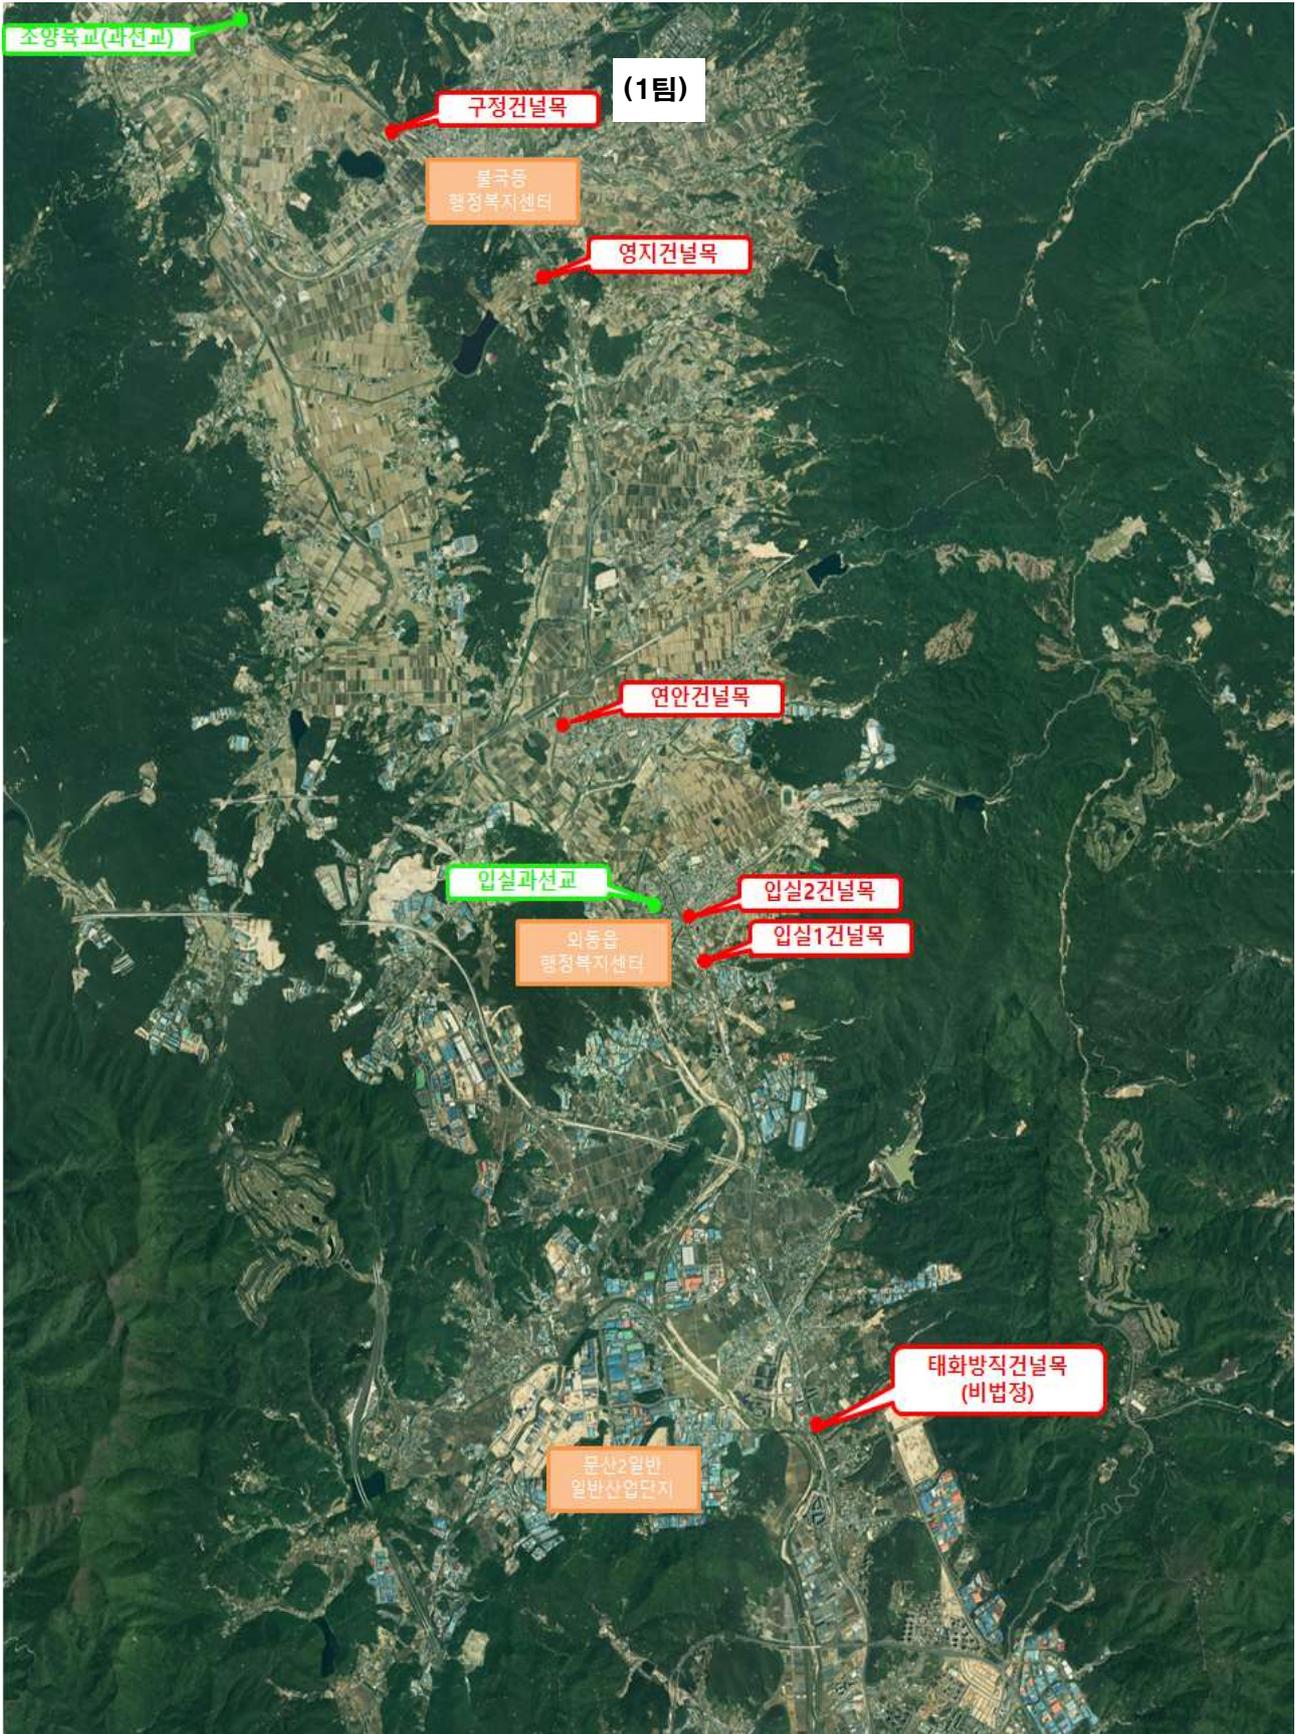

## 주차공간 대폭 확충 [주요 관광지 주변 및 주거·상가 밀집지역]

신규여부 신규	예산구분 예산	완료시기 임기내	사업주체 경주시	추진상황 이행후 계속추진
------------	------------	-------------	-------------	------------------

### □ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 주요관광지 주변, 주거·상가 밀집지역 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 총사업비 : (계획) 500억원 정도 / (추진) 650억원 정도
- 사업내용 : 주차장 조성 2,500면
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
단위사업별 예산확보, 토지보상, 설계 및 조성공사				

### □ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	65,977	0	13,635	19,908	7,934	24,500	31,201	0	11,418	18,008	1,775	0	
국 비	570		570				568		0	525	43		
도 비	5,680			1,200	620	3,860	6				6		
시 비	59,727		13,065	18,708	7,314	20,640	30,627		11,418	17,483	1,726		
기 타	0						0						

### □ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 100% (지표 달성 후 추가 목표 이행)
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

## □ 추진경과(주요성과)

○ 2022. 7 ~ 2024. 12 : 주차장 확충 면수 (42개소 · 3,183면)

[ 경주문화관광 황남(대형환승) 주차장 조성 - 1개소 · 894면 ]

- 2021. : 지방재정투자심사, 문화재청 현상변경, 도시계획시설결정(변경)
- 2022. : 보상협의 업무추진(한국부동산원)
- 2023. : 실시계획인가 고시(998면), 토지수용재결 신청
- 2024. : 문화재시발굴
- 2025. : 공사 착공 및 준공

※21~25까지 총사업비 245억 전체 확보 완료


[ 단위 주차장 조성 완료 - 41개소 · 2,289면 ]

- 2022. 8. : 신경주역 공영주차장 조성완료(438면 확장)
- 2022. 11. : 경주 중심상가 공영주차장 조성완료(209면 확장)
- 2022. 7. ~ 2024. 6. : 소규모 공용주차장 조성 완료(26개소, 393면)
- 2023. 1. : 봉황대 공영주차장 조성 완료(100면)
- 2023. 3. : 황성동 폐철도부지 임시주차장 조성 완료(6개소, 560면)
- 2023. 6. : 황성동 공영주차장 조성 완료(99면),  
황남 생활문화센터 주차장 조성 완료(35면)  
양남면소재지 공용주차장 조성 완료(27면)
- 2023. 9. : 용황지구 임시주차장 조성 완료(300면),  
서면소재지 공용주차장 조성 완료(30면)
- 2024. 12. : 석장동 공용주차장 조성 공사 완료(98면)

## □ 향후계획

○ 2025. ~ : 단위사업별 지속 추진

□ 위치도 및 조감도 - 황남(대형환승)주차장

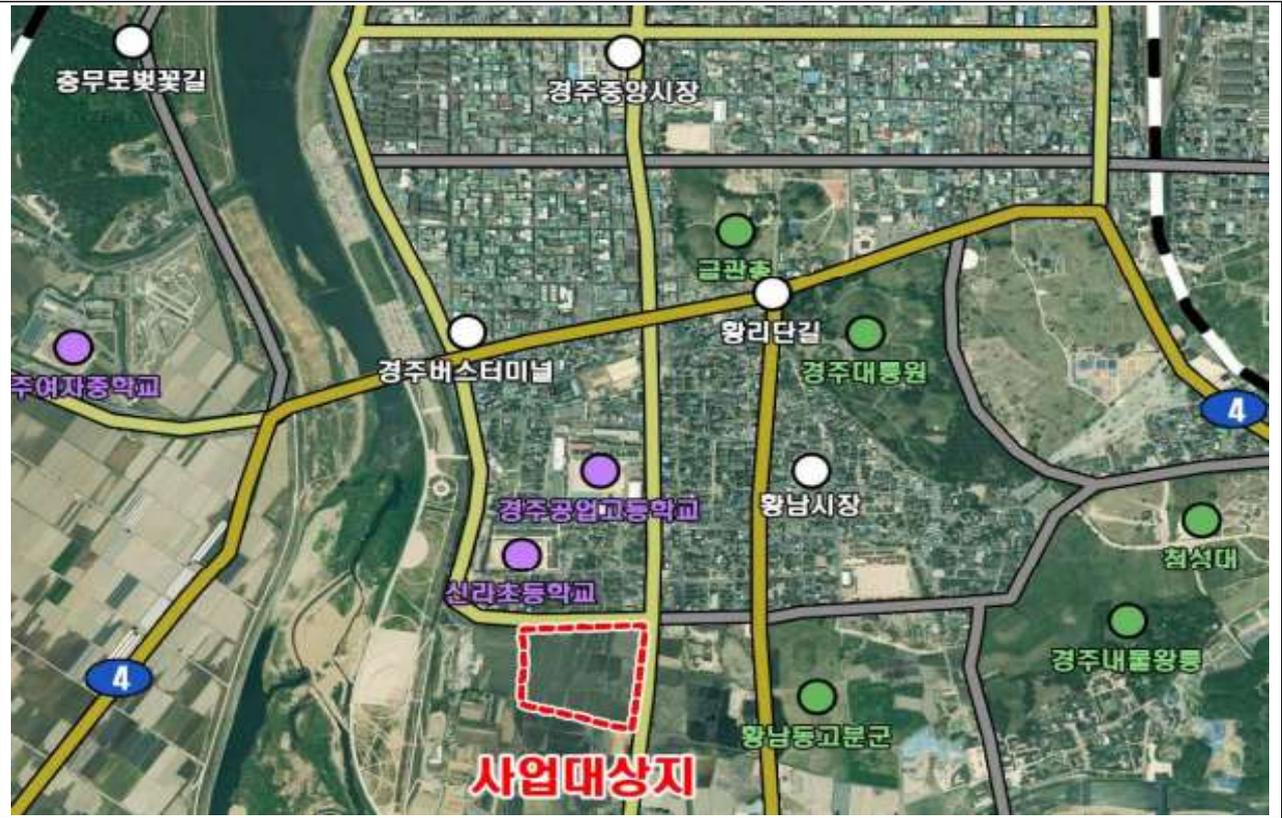

관련 부서	주관부서	교통행정과	과장 임정택(6520)	교통시설팀장 박순탁(6841)	담당자 이수진(6535)
