

II . 관광산업 혁신, 관광객 2천만 시대



신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기내	경주시	완료

- 첨단 디지털 기술과 관광서비스를 융합한 新관광객 맞춤형 편의서비스 제공 필요
- 포스트 코로나 대비 K-관광 서비스 · 인프라 산업 선제 육성

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 황리단길 및 대릉원 일원
- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2025. 3.(3년간)
- 사업비 : 90억원(국 45, 도 13.5, 시 31.5)
- 사업내용 : 예약결제 시스템 ‘경주로ON’ 플랫폼 개발, 여행자 라운지 운영, 디지털 사이니지 설치, 교통정보연계플랫폼 개발 등
- 사업주체 : 한국관광공사, 경상북도, 경주시, 한국스마트관광컨소시엄 (재)경주스마트미디어센터
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
업무협약 사업비(국)교부 예산확보 원가산정 과업심의위원회 정보화사업사전협의 보안성 검토 PMO용역발주 감리사업자선정 1차년도사업착수	1차년도사업완료 고도화(2차)사업착수 예산확보	2차년도고도화완료 3차년도고도화착수 예산확보 및 고도화 완료	3차년도고도화완료 및 운영	

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	9,350	0	4,700	3,300	850	500	8,545	0	4,484	3,217	844	0	
국 비	4,500		1,200	2,800	500		4,417		1,200	2,717	500		
도 비	1,200		1,050	150	0		996		846	150	0		
시 비	3,650		2,450	350	350	500	3,132		2,438	350	344		
기 타	0		0	0	0		0		0	0	0		

□ 추진현황 : 완료

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 100%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과 및 향후계획

- 2022. 7. ~ 12. : 사업비 교부(국비) 및 PMO용역, 감리용역
- 2022. 9. ~ 2023. 4. : 과업심의위원회 개최, 정보화사업 사전협의, 보안성 검토
- 2022. 9. ~ 2023. 9. : 사업개발 및 구축 완료(1차년도)
- 2023. 10. ~ 2023. 11. : 구축년도 사업평가 및 고도화사업계획수립
- 2023. 12. ~ 2024. 5. : 사업 1차 고도화 완료(2차년도)
 - 경주로ON 앱 유지보수, 콘텐츠 업데이트, 홍보 마케팅, 여행자라운지 및 미디어월 등 유지관리 등
- 2024. 6. ~ 2024. 12. : 사업 2차 고도화 완료(3차년도)
 - 경주로ON 앱 기능 안정화, 콘텐츠 업데이트, 홍보 및 마케팅 강화

□ 문제점 및 대책

- 고도화 기간 국비지원 종료 후 유지관리비용 발생(추정사업비 연 5억원)
- 지역 행사와 연계한 경주로ON 앱만의 특색있는 콘텐츠 개발 필요

관련 부서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광정책팀장 조영화(6981)	담당자 김도훈(6983)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

- 경북관광기업지원센터를 경주에 구축하여 수도권에 편중된 창업 수요를 지역으로 유도하여 지역관광산업 활성화 도모

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 계림로 107 천년빌딩 3층 ~ 7층(면적 1,584.26㎡)
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년)
- 총사업비 : (계획) 100억원(국 50, 도 25, 시 25)
(추진) 96억원(국 48, 도·시비 48)
- * 2022년도 20억원(국 10, 도 5, 시 5), 2023년도 20억원(국 10, 도 5, 시 5),
2024년도 18억원(국 9, 도 4.5, 시 4.5), 2025년도 18억원(국 9, 도 4.5, 시 4.5)
- ※ 매년 성과평가 통해 운영비(국비) 차등 지원 (8~10억원)
- 추진체계 : 주관-경상북도, 참여-경주시, 운영-경북문화관광공사
- 주요시설 : 방문자센터, 상담실, 회의실, 입주기업 사무실 등
- 사업내용
 - 경북관광기업지원센터 구축
 - 지역관광 스타트업 창업 및 기업 육성지원(교육, 컨설팅 공간 제공 등)
 - 지역 전통적 관광기업 개선 지원(컨설팅, 경영진단, 종사자서비스교육 등)
 - 관광 일자리 허브 운영(알자리 정보·DB구축, 미니잡페어, 교육, 지역 대학생 인턴십 지원 등)
 - 지역 관광산업 활성화를 위한 지원사업(관광콘텐츠 개발 지원 등)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
·센터 리모델링 및 개소 ·인력선발 ·입주기업 유치	·센터 및 사업 운영보완 ·콘텐츠 개발 ·일자리 창출	·입주기업 대상 안정화 지원 ·기업육성 지원	·입주기업 및 지역기업 경영 혁신 지원 ·산학관 관광산업 거버넌스 구축	·센터운영 및 지역관광기업 지원 안정화 ·지속적 성장지원 체계 구축

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	7,600	0	2,000	2,000	1,800	1,800	7,600	0	2,000	2,000	1,800	1,800	
국 비	3,800		1,000	1,000	900	900	3,800		1,000	1,000	900	900	
도 비	1,900		500	500	450	450	1,900		500	500	450	450	
시 비	1,900		500	500	450	450	1,900		500	500	450	450	
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 100%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과 및 향후계획

- 2022. 7. : 경북관광기업 지원센터 공사 발주
- 2022. 7. ~ 8. : 2022년 제1회 추경편성 및 사업비 교부
- 2022. 8. ~10. : 인력 채용(센터장 등 6명) 및 입주기업(10개사 모집), 사업화자금지원(6개사 모집)
- 2022. 8. ~11. : 공사 착공 및 준공
- 2022. 11. ~ 2023. 3. : 센터 개소, 1차년도 사업 운영 및 평가
- 2023. 4. ~12. : 2차년도 사업계획 수립 및 운영
- 2024. ~ 2025. 5. : 3~4차년도 사업계획 수립 및 추진, 입주기업 대상 안정화 및 경쟁력 확보를 위한 기업육성 지원
 - 관광스타트업 발굴 및 육성, 지역 기반 관광산업 개선, 협력 네트워크 강화, 관광인재육성 및 일자리 창출 등
 - 입주기업 20개사(2025. 5월기준)
 - 일자리창출 99명, 관광기업 컨설팅 건수 123건

관련 부서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광정책팀장 조영화(6981)	담당자 이준한(6982)
----------	------	--------	--------------	------------------	---------------

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진현황
신규	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사 업 비 : (계획) 5,885백만원 (도 440, 시 5,445)
(추진) 8,786백만원 (국 500, 도 1,166, 시 7,120) ※ 2025년 기준
- 사업내용 (2025년도, 5,399백만원 (국 500, 도 982, 시 3,917))
 - 계절별 축제, 페스타 프로그램 기획
 - (봄/여름) 경주대릉원돌담길축제, 2025 MYK Festa in 경주
(가을) 제52회 신라문화제
(겨울) 윈터포차라이트
- 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026
• 사업콘텐츠 구성 • SNS홍보 • 안전대책 • 예산확보	• 사업콘텐츠 구성 • SNS홍보 • 안전대책 • 예산확보	• 축제운영 및 페스타운영 지속 지원 • 사업콘텐츠 구성 • SNS홍보 • 안전대책 • 예산확보	• 축제운영 및 페스타운영 지속 지원 • 사업콘텐츠 구성 • SNS홍보 • 안전대책 • 예산확보	• 축제운영 및 페스타운영 지속 지원 • 사업콘텐츠 구성 • SNS홍보 • 안전대책 • 예산확보

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	8,786	0	1,177	1,142	1,068	5,399	3,697	0	1,177	1,142	1,068	310	
국 비	500					500	0						
도 비	1,166		88	58	38	982	204		88	58	38	20	
시 비	7,120		1,089	1,084	1,030	3,917	3,493		1,089	1,084	1,030	290	
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 100% (매년 이행완료되는 사업)
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과

【2025 경주 사계축제 개최】

○ (봄) 경주대릉원돌담길축제

- 기 간 : 2025. 4. 4.(금) ~ 4. 6.(일) [3일간], 대릉원돌담길 일원
- 사 업 비 : 310백만원 (도20 시비290)
- 사업내용 : 벚꽃명, 벚꽃같이보강, 플리마켓 등 운영

○ (여름) 2025 MYK Festa in 경주

- 사업기간 : 2025. 6. 7.(금) ~ 6. 8.(일) [2일간], 경주예술의전당 일원
- 사 업 비 : 1,500백만원 (국500, 도500, 시500)
- 사업내용 : K팝 릴레이공연, 커버댄스, G캠프닉 등

○ (가을) 제52회 신라문화제

- 기 간 : 2025. 9. ~ 10월 중
- 사 업 비 : 2,881백만원(도462, 시2,419)
- 사업내용
 - 축 제 : 화백제전, 실크로드페스타, 시민축제운영단 등
 - 예 술 제 : 예충 예술제, 화평서제, 농악경연대회 등

○ (겨울) 윈터포차라이트

- 기 간 : 2025. 11월 예정, 구) 경주역
- 사 업 비 : 150백만원 (시비)
- 사업내용 : 포차라운지, 포차라디오, 조명빛체험 공간 조성 등

【관광 페스타 개최】

○ 교촌마을 문화공연(신라오기)

- 사업기간 : 2025. 3월, 4월, 10월 [3개월간]
- 총사업비 : 135백만원 (시비)
- 사업내용 : 고운 최치원 향약잡영을 활용한 마당놀이극

○ 2025 경주국악여행

- 사업기간 : 2025. 4. 19.(토) ~ 10. 5.(일) [6개월]
- 총사업비 : 225백만원 (시비)
- 사업내용 : 국악예술단체 9개팀, 신진예술인의 관광지 국악 버스킹 행사

○ 신라의 달밤 165리 걷기대회

- 사업기간 : 2025. 6. 14.(토) ~ 6. 15(일) [2일간]
- 총사업비 : 80백만원 (도18, 시62)
- 사업내용 : 경주일원 걷기대회 하프코스(75리,30km), 힐링코스(25리,10km)

○ 해파랑길 걷기대회

- 사업기간 : 2025. 11월 예정
- 총사업비 : 25백만원 (시비)
- 사업내용 : 스마트폰 어플, SNS 등 비대면 참가·인증시스템 활용

관련
부서

주관부서

관광컨벤션과

과장 서은숙(6980)

관광마케팅팀장 김보은((6077)

담당자 이시안(6078)

보문관광단지 리모델링 [제2동공원 조성사업]

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기내	경주시	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 보문동 3-3번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2025년(8년)
- 사 업 비
 - (계획) 384억원 (균특(전환) 161, 도비 20.7, 시비 202.3)
 - (추진) 458억원 (균특(전환) 161, 도비 20.7, 시비 202.3, 시추 74)
- 사업내용 : 거울연못 2개소, 사계절초화원, 꽃등나무정원, 주차장 299면, 최첨단 디지털 체험관 1동, 전시연출 등
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
공사착공	공사진행	공사진행 전시연출 발주	공사준공 전시연출 준공	

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	45,800	19,434	6,571	2,857	6,522	10,416	31,395	14,122	2,319	4,723	7,106	3,125	
국 비 (전환)	16,100	3,300	2,500	2,000	4,300	4,000	8,776	1,374	968	2,023	3,154	1,257	
도 비	2,070	424	321	257	552	516	1,131	176	126	260	406	163	
시 비 (시추포함)	27,630	15,710	3,750	600	1,670	5,900	21,488	12,572	1,225	2,440	3,546	1,705	
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 85%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과(주요성과)

- 2019. 12. 11. : 실시설계용역 완료
- 2020. 2. 26. : 문화재 현상변경 심의 완료
- 2020. 9. 24. : 경상북도 건설기술심의 완료
- 2020. 11. 2. : 관광단지 및 유원지 조성계획 변경 완료
- 2021. 2. 18. : 실시계획 인가 고시
- 2021. 4. 19. : (토목,조경) 공사 착공
- 2022. 9. 21. : 건설사업관리 용역 착수
- 2022. 11. 17. : (전기) 공사 착공
- 2022. 12. 2. : (소방) 공사 착공
- 2023. 7. 11. : (건축) 공사 재착공
- 2024. 1~ 4. : 소방, 통신, 전기, 조경·토목 공사 중지 해제
- 2024. 4. 23. : 경주식물원(라원) 실감콘텐츠 제작 설치 용역 착수
- 2024. 5. 8. : (조경,토목) 1차분 준공

□ 향후계획

- 2025. 6. : 시설물 공사 완료
- 2025. 9. : 건축물 사용승인(BF, 제로에너지 등 행정절차 완료)
- 2025. 10. : 25년 APEC 대비 시범개장

□ 문제점 및 대책

- '19년도 실시설계 완료 후 사업 실지 착공 지연에 따른 자재단가 상승 등 여러 요인으로 공사비가 증가하였으나 시비를 추가로 확보하였으며, '25년 10월 APEC 대비 시범 개장을 차질 없이 추진하겠음.

□ 현황사진

위치도		현장사진			
					
관련부서	주관부서	동공원	과장 김재훈(8723)	시설유지팀장 손근영(8984)	담당자 김동인(8985)

보문관광단지 리모델링 [경관조명 등 인프라 확충]

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진현황
계속	예산	임기내	경주시/민자	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

○ 보문관광단지 야간경관 개선사업

- 위 치 : 보문관광단지 내 APEC 행사장 일원
- 사업기간 : 2024 ~ 2025년
- 총사업비 : (계획) 200억원(국비 100, 도비 100)
(추진) 150억원(국비 75, 도비 37.5, 시비 37.5)
- 사업내용 : 호반광장 상징조형물, 가로경관 개선, 미디어조명 설치 등
- 사업주체 : 경주시, 경상북도 문화관광공사

○ 보문 호반산책로 조명보강사업

- 목 적 : 보문관광단지 호반산책로의 조명을 보강해 야간명소로 조성
- 위 치 : 천군동 산339-13 일원(약 3km)
- 기 간 : 2021 ~ 2023년 (준공)
- 사 업 비 : 15억원(도비 65%, 시비 35%)
- 사업방법 : 공기관대행 (경북문화관광공사)
- 사업내용 : 투광등, RGB수목등 등 야간경관조명 설치 1식

○ 보문관광단지 상징조형물 설치

- 목 적 : 경주와 보문호의 특색을 반영한 상징조형물 설치를 통해 관광객들에게 볼거리 제공
- 위 치 : 신평동 552 (보문호 고사분수)
- 기 간 : 2022 ~ 2023년 (준공)
- 사 업 비 : 5억원(시비 100%)
- 사업내용
 - 상징조형물 설치 1식(고사분수 위 16m×16m 규모의 조형물)
 - 보문호 경관에 어울리며 경주의 상징적 의미 담은 조형물 조성

□ 연도별 추진목표

사 업	2022	2023	2024	2025
보문관광단지 야간경관 개선			사업 협약 체결	착공 및 준공
보문 호반산책로 조명보강	공사 착공	공사 준공		
보문 상징 조형물 설치	공사 착공	공사 준공		

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	33,400	0	2,000	16,400	0	15,000	2,000	0	2,000	0	0	0	
국 비	8,250		750			7,500	750		750				
도 비	3,975		225			3,750	225		225				
시 비	4,775		1,025			3,750	1,025		1,025				
기 타	16,400			16,400			0						

□ 추진현황 : 이행후 계속추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 50%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진경과[주요성과]

- 보문 호반산책로 조명보강사업
 - 2021. 3. : 사업추진 협약 체결[경북문화관광공사↔경주시]
 - 2021. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수
 - 2022. 6. : 기본 및 실시설계용역 완료
 - 2022. 7. : 조달청 의뢰(원가심사 및 계약)
 - 2022. 8. : 계약 및 착공
 - 2023. 6. : 공사 준공
- 보문 상징 조형물 설치
 - 2022. 5. : 사업추진 협약 체결[경북문화관광공사↔경주시]
 - 2022. 9. : 상징조형물 제작 설치 발주(협상에 의한 계약)
 - 2023. 12. : 공사 준공
- APEC 행사장 보문단지 야간경관 개선사업
 - 2024. 12. : 보문관광단지 야간경관 개선 기본구상 용역 완료
 - 2025. 5. : 상징조형물 제작 설치 발주(협상에 의한 계약)
 - 2025. 5. : 미디어조명 및 빛광장 조성 발주(협상에 의한 계약)
 - 2025. 9. : 공사 준공 예정

관련
부서

주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광개발팀장 이신광(6081)	담당자 김동완(6083)
------	--------	--------------	------------------	---------------

14-1

동서남북 新관광단지 조성 추진 [서경주 5-PEAK 관광단지 조성]

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기후	민간투자	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 서면 도계리, 서오리, 천촌리 일원
- 기 간 : 2022 ~ 2028년
- 사 업 비 : 320,000백만원(조성비 250,000, 보상비 50,000, 기타 20,000)
- 사업규모 : 2,423,581㎡(약 73만3천평) 토지매입율(73%)
- 사업내용
 - 숙박시설(포레스트 콘도, 골프텔, 폴로스테이, 힐링스테이, 도계리문화예술마을
 - 상가시설, 휴양문화시설(수목원, 아트센터, 경주낭만복고)
 - 운동오락시설(골프파크, 폴로파크)
- 사업주체 : (주)루브루 (*성호그룹)
- 연도별 추진목표

2022	2023~2025	2026 ~ 2028
관광단지 지정신청	관광단지 지정 및 조성계획 승인 신청	조성계획 시행 및 운영

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	
국 비	0						0						
도 비	0						0						
시 비	0						0						
기 타	15,000			15,000			15,000			15,000			토지매입

□ **추진현황 : 이행후 계속추진**

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 20%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여


□ **추진경과**

- 2022. 6. : 관광단지 지정 승인 신청
- 2023. 6. : 환경영향평가 항목등의 결정 내용 공개
- 2023.10. ~ 12. : 환경영향평가서(초안) 대구지방환경청 협의
- 2024. 6. : 관광단지 지정 및 조성계획 승인 신청
- 2024. 9. : 문화관광체육부 관광단지 현장실사
- 2025. 2. : 환경영향평가, 교통영향평가 협의완료
- 2025. 5. : 재해영향평가, 경관심의 진행중

□ **향후계획**

- 2025. 12. : 관광단지 지정 및 조성계획 승인 예정
- 2026. ~ : 관광단지 사업시행

□ **현황사진**

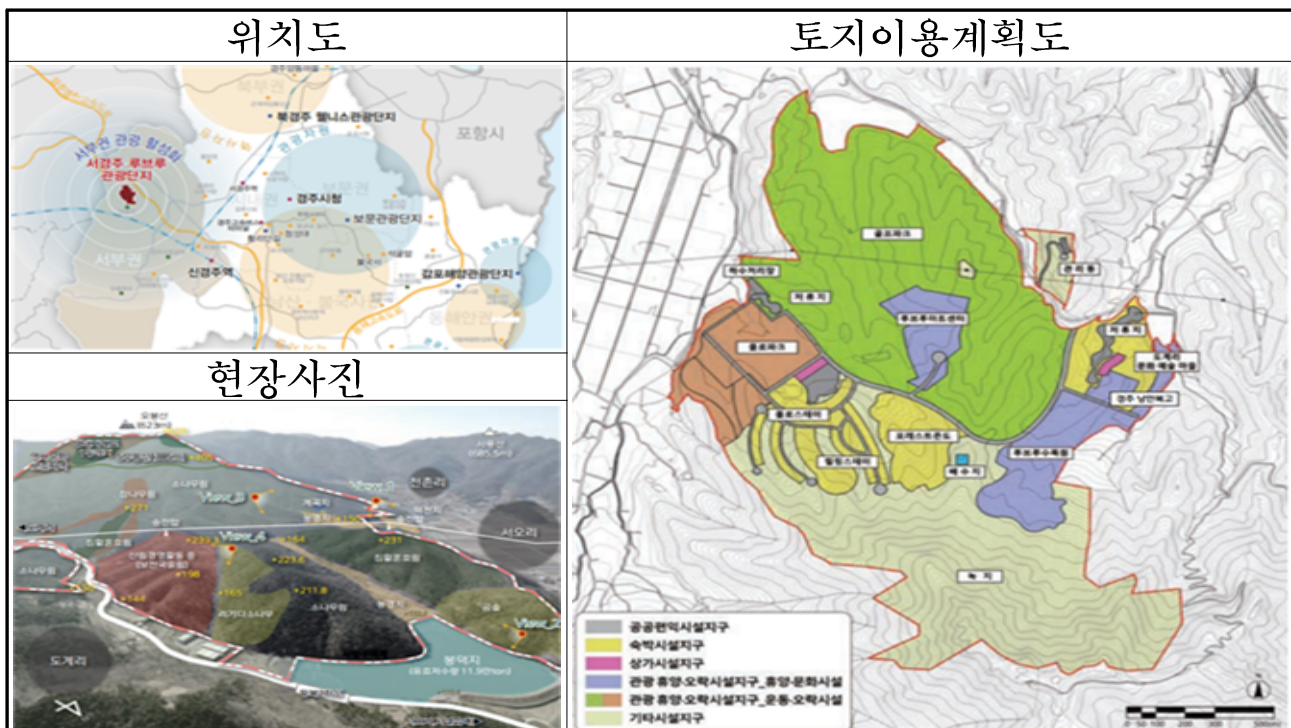

관련 부서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광개발팀장 이신광(6081)	담당자 정서영(6082)

14-3

동서남북 新관광단지 조성 추진 [북경주 웰니스 관광단지 조성]

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기후	민간투자	이행후 계속추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 안강읍 검단장골길 181-17 일원
- 기 간 : 2019 ~ 2028년
- 사 업 비 : 160,000백만원
- 사업규모 : 606,740㎡(약 18만3천평) 토지매입율(90%)
- 사업내용
 - (숙박시설) 단독 및 타워형 콘도
 - (휴양문화시설) 오토캠핑장, 웰니스복합문화타운
 - (운동오락시설) 골프장 (9홀), 파크골프장 등
- 사업주체 : (주)월성종합개발
- 연도별 추진목표

2022 ~ 2023	2024 ~ 2028
조성계획 승인 신청 준비 및 기간 연장	조성계획 승인, 사업 시행 및 운영

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	276	0	0	276	0	0	276	0	0	276	0	0	
국 비	0						0						
도 비	0						0						
시 비	0						0						
기 타	276			276			276			276			토지매입

□ **추진현황 : 이행후 계속추진**

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 20%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여


□ **추진경과**

- 2019. 8. : 관광단지 지정 신청
- 2021. 7. : 북경주 웰니스 관광단지 지정 승인
- 2024. 6. : 관광단지 지정(변경) 및 조성계획 승인 신청
- 2025. 2. : 환경영향평가, 교통영향평가 협의완료
- 2025. 5. : 재해영향평가 심의 중

□ **향후계획**

- 2025. 12. : 관광단지 지정 및 조성계획 승인 예정
- 2026. ~ : 관광단지 사업시행

□ **현황사진**

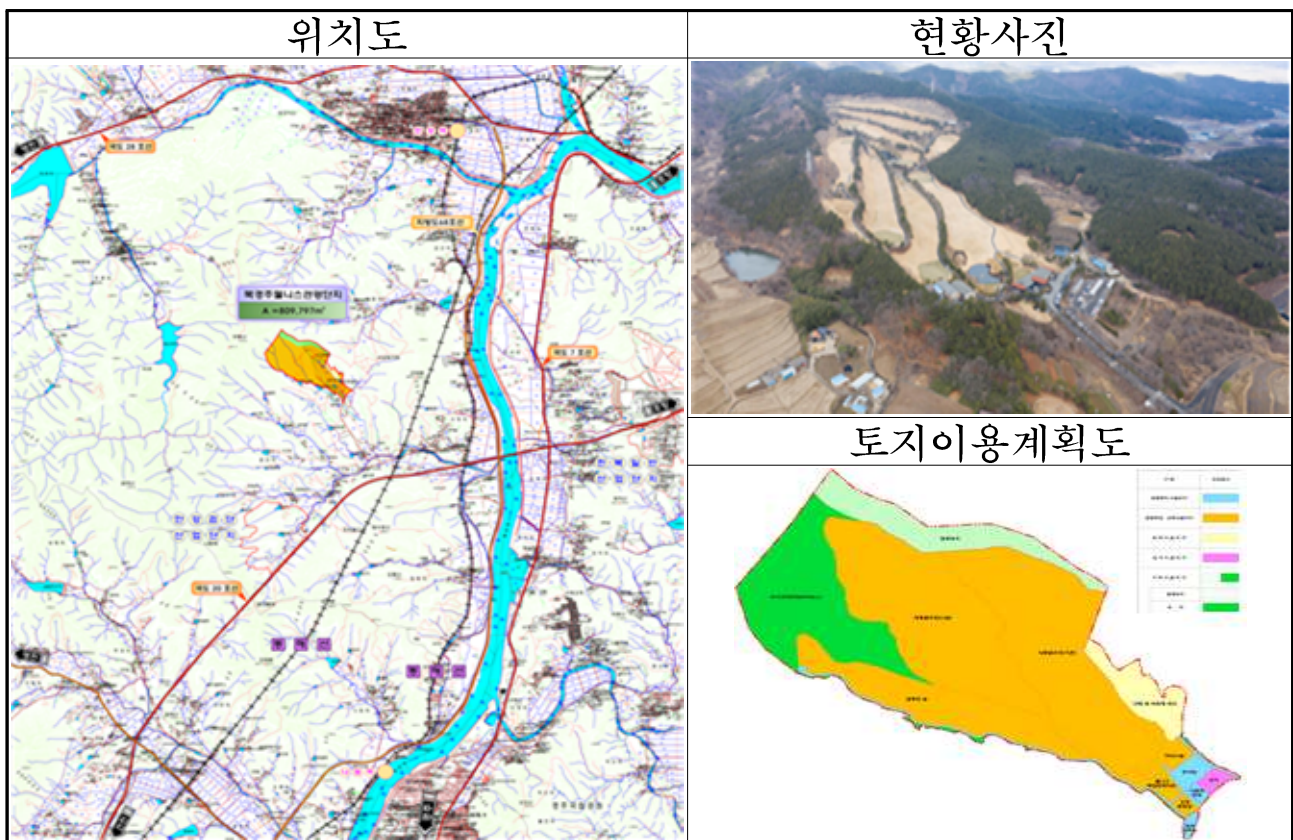

관련 부서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광개발팀장 이신광(6081)	담당자 정서영(6082)
----------	------	--------	--------------	------------------	---------------

15-1

국제화백MICE 관광도시 육성 (HICO 증축)

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
계속	예산	임기내	경주시	정상추진

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 보문로 507, 경주화백컨벤션센터 내
- 기 간 : (계획)2021 ~ 2025년(5년) / (추진)2020 ~ 2027년(8년)
- 사 업 비
 - (계획) 29,500백만원(균특 11,900 도비 1,500 시비 15,300 특교 800)
 - (추진) 38,300백만원(균특 11,900 도비 5,900 시비 19,700 특교 800)
- 사업내용 : 11,342㎡ 증축
(전시장 3,730㎡, 주차타워 5,964㎡ 및 기타시설 1,648㎡)
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025	2026
설계 발주	설계 완료	공사 착공	공사 준공	

□ 예산확보 및 집행내역

(단위 : 백만원)

구 분	확 보 액						집 행 액						비고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	15,209	700	2,100	7,638	4,771	0	1,439	0	1,337	50	52	0	
국 비	6,500		500	3,000	3,000		500		500				
도 비	860		150	355	355		150		150				
시 비	7,049	700	650	4,283	1,416		789		687	50	52		
기 타	800		800				0						

□ 추진현황 : 정상추진

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 15%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 부

□ 추진경과(주요성과)

- 2019. 5. : 입지규제 최소구역 지정으로 건폐율 완화(20%→40%)
- 2020. 9. : 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2021. 2. : 산업통상자원부 전시산업발전협의회 협의 완료
- 2021. 8. : 행정안전부 지방재정 투자 심사 통과('21. 6. 심사 의뢰)
- 2022. 5. : 설계 공모 용역 발주
- 2022. 8. : 기본 및 실시설계 발주
- 2023. 2. : 건축설계용역 변경계획 보고(전시장 필로티 구조 → 지상1층)
- 2023. 5. : 경상북도 문화관광공사 설계심의
- 2023. 5. : 경주시 경관심의(자문)
- 2024. 4. : 인허가 협의 및 심의
- 2024. 5. : 설계용역 중지
- 2025. 4. : 사업 변경계획 보고(미디어센터 가설건축물 → 일반건축물)

□ 문제점

- 제32차 APEC 정상회의 개최도시로 경주시가 선정되어 필수시설인 국제 미디어센터를 정상회의장 외부에 별도 설치하여야 함
- 하이코 증축사업에 계획된 주차타워 부지 내 미디어센터 건립으로 사업 계획 수정 필요

□ 대책

- POST APEC으로 중장기 발전계획 수립을 위한 타당성 및 기본구상 용역을 시행하여 MICE산업 발전 방향 및 컨벤션센터 단계적 확장 계획 결정
- APEC 정상회의 이후 미디어센터를 일반건축물로 전환하여 전시장으로 활용

관련 부서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	관광관리팀장 박해근(6830)	담당자 임민경(6834)
----------	------	--------	--------------	------------------	---------------

국제화백MICE 관광도시육성 2025년 APEC 정상회의 경주 유치

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	추진상황
신규	예산	임기내	경주시	완료

□ 공약 실천계획 및 추진사업 개요

- 위 치 : 경주시 보문로 507 경주화백컨벤션센터 일원
- 사업기간 : (계획)2022 ~ 2023년(2년) / (추진)2022 ~ 2024(3년)
- 사 업 비
 - (계획) 684백만원 (도비 325, 시비 359)
 - (추진) 5,395백만원 (도비 2,245, 시비 3,150)
- 사업내용 : 2025 APEC 정상회의 유치 및 홍보사업 지원
- 사업주체 : 경상북도, 경주시
- 연도별 추진목표

2022	2023	2024	2025
APEC 유치지원 홍보	민간추진위원회 구성 및 대정부 유치 활동	APEC 개최도시 확정 APEC 정상회의 준비	APEC 정상회의 개최

□ 예산확보 및 집행내역

〈단위 : 백만원〉

구 분	확 보 액						집 행 액						비 고
	계	임기전	2022	2023	2024	2025	계	임기전	2022	2023	2024	2025	
계	5,395	0	450	3,102	1,843	0	4,761	0	285	3,023	1,453	0	
국 비	0						0						
도 비	2,245		175	1,150	920		1,985		110	1,150	725		
시 비	3,150		275	1,952	923		2,776		175	1,873	728		
기 타	0						0						

□ 추진현황 : 완료

- 공약진도율(2025년 6월말 기준) : 100%
- 2025년 추진목표 달성 가능여부 : 여

□ 추진 경과

- 2021. 7. 6. **2025 APEC 정상회의 경주유치 도전 선언**(경상북도·경주시)
- 2023. 1. 1. 2025 APEC 경주유치 전담조직(TF) 구성
- **2023. 3. 30. 2025 APEC 경주유치 범시민추진위원회 출범**
- 2023. 5. 04. 경주시의회 2025 APEC 경주 유치지원특별위원회 구성
- 2023. 9. 7. 2025 APEC 경주유치 희망 포럼(100만 서명운동 출정식)
- 2023. 10. 26. 싱가포르 APEC 사무국 방문 및 총장 면담
- 2023. 11. 7. 2025 APEC 경주유치 기원 슈퍼콘서트
- 2023. 11. 17. 2025 APEC 정상회의 경주 유치 추진단 구성(TF팀 재편)
- 2023. 11. 21. 2025 APEC 정상회의 경상북도유치 특별위원회 구성
- 2023. 12. 14. 2025 APEC 정상회의 100만 서명운동 서명부 전달식
- 2024. 1. 8. APEC 정상회의 경주유치 6개 연관기관 업무협약체결
- 2024. 2. 13. 온 시민과 함께하는 시민의식 선진화 및 손님맞이 캠페인 실시
- 2024. 2. 24. 2025 APEC 정상회의 경주 유치기원 정월대보름 행사
- 2024. 3. 27. 2025 APEC 경주유치 강점 및 당위성 외교부 건의
- 2024. 3. 28. 2025 APEC 정상회의 개최도시 선정계획 설명회 참석
- 2024. 4. 19. 2025 APEC 정상회의 경주 유치신청서 외교부 제출
- 2024. 5. 20. 외교부 개최도시선정위원회 후보도시 현장실사
- **2024. 6. 27. 2025 APEC 정상회의 개최도시 경주 유치 확정**

관련 부서	주관부서	관광컨벤션과	과장 서은숙(6980)	APEC 경주유치 T/F팀장 김준용(6797)	담당자 서민진(6798)
----------	------	--------	--------------	------------------------------	---------------
