

PART VI

쾌적하고 아름다운 친환경 도시



친환경 도시가스 공급망 확대 [보급률 72%⇒85%]

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 시민들에게 친환경 에너지인 도시가스공급을 확대하여, 주거 여건 개선과 에너지 복지 실현 및 연료비 절감에 기여하고자 함.

□ 정책목표

- 친환경 에너지(도시가스) 공급망 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 관내
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 총사업비 : 136억원(도 12, 시 76, 가스사 48)
- 사업내용 : 도시가스 배관망사업(120억), 단독주택 보조사업(16억)
- 사업주체 : 경상북도/경주시/가스사

□ 사업별 성과지표 : 도시가스 보급률

- 연도별 보급률 계획
 - 2023년 : 74%
 - 2024년 : 77%
 - 2025년 : 81%
 - 2026년 : 85%

□ 향후계획

- 도시가스의 지속적인 공급망 확대
- 기존 설치 구간에 대한 안전관리

마을단위 생활쓰레기·영농폐기물 처리종합대책 추진

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 단독주택, 농어촌지역 등은 분리배출 취약지역으로 거점배출시설인 생활쓰레기 공동집하장 설치로 올바른 생활쓰레기 배출문화 정착 필요
- 영농폐기물 공동집하장 확충으로 농촌지역 폐기물 불법소각을 예방하여 깨끗한 농촌 환경 조성

정책목표

- 생활쓰레기 공동집하장 200개소(기추진 93) 설치
- 영농폐기물 공동집하장 60개소(기추진 28) 설치

사업개요

- 위 치 : 경주시 관내
- 사업기간 : 2021 ~ 2026
- 총사업비 : 2022년 기준 1,290백만원(국비 31, 도비 22, 시비 1,237)
- 사업내용 : 생활쓰레기·영농폐기물 공동집하장 설치
- 사업주체 : 경주시

사업별 확인지표 : 공동집하장 설치 개소 수

향후계획

- 읍/면/동 수요조사(수시)
- 수요량에 따른 설치(시 입찰 및 읍면동 예산 재배정)

연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
생활쓰레기 55개소 영농폐기물 9개소	생활쓰레기 22개소 영농폐기물 5개소	생활쓰레기 10개소 영농폐기물 6개소	생활쓰레기 10개소 영농폐기물 6개소	생활쓰레기 10개소 영농폐기물 6개소

○ 예산확보 계획



〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	입기전	입 기 내					입기후
			계	2022	2023	2024	2025	
계	2,445		2,445	1,290	385	275	275	220
국 비	31		31	31				
도 비	22		22	22				
시 비	2,392		2,392	1,237	385	275	275	220
민 자								

문제점 및 대책

- 설치부지 부족으로 인한 어려움이 있으나 읍면동에 꾸준한 설치 독려로 사업 조기 마무리

현황사진

생활쓰레기 공동집하장 현장사진	영농폐기물 공동집하장 현장사진
	

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경주시	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 2021.12. 폐선 된 동해남부선 철로 변 완충녹지를 활용한 산책로, 광장 등으로, 형산강~북천을 잇는 상생의 도시숲 공원 조성
- 폐철도 부지와 연계한 체계적이고 효율적인 개발로 지역 거점 인프라 구축 및 주민들의 삶의 질 제고

□ 정책목표

- 경주시 동천 ~ 황성 구간의 폐선로와 인근 완충녹지를 지역 주민의 여가 및 커뮤니티 공간으로 개발하여 지역 주민 삶의 질을 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 동천동, 황성동 일원 (폐선부지 변 완충녹지)
- 사업기간 : 2020 ~ 2028년
- 총사업비 : 665억원(토지보상비 565억원, 공사비 100억원)
- 사업주체 : 경주시
- 사업내용
 - 면적 : 135,200㎡ (L=2.5km, B=50~55m)
 - 공원, 휴식광장, 산책로, 운동시설, 자전거도로 및 주차장 등 조성
 - ※ 부지 내 주차시설 설치 등에 관한 사항은 예산 및 관련 법률 등을 검토하여 교통행정과와 협의하여 추진 (보상완료 후 공원실시설계 시 반영예정).
 - 추진실적
 - 20. 6. : 도시계획시설(완충녹지) 실시계획인가 고시
 - 22. 1. : 지방재정투자사업 타당성조사 및 중앙투자심사 완료
 - 23. 10. ~ 12. : 국유재산 용도폐지 완료
 - 24. 7. : 사유지 토지 보상완료(211필지 71,429㎡)
 - 25. 6. : 도시관리계획(완충녹지→공원)결정(변경)
 - 25. 6. : 기본설계용역 착수

사업별 확인지표

- 토지 보상률
- 예산 집행률

향후계획

- 2026. : 국유지 매입, 공원조성계획수립
- 2026. : 실시설계 및 실시계획인가
- 2027. : 동천~황성 도시숲 조성사업 착공
- 2028. : 동천~황성 도시숲 조성사업 준공

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2023	2024	2025	2026	2027	2028
예산확보	사유지 보상완료	기본설계용역 도시관리계획결정	국유지 매입 실시설계 및 실시계획인가	공사착공	공사준공

- 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후	
			계	2022	2023	2024	2025		2026
계	66,500	22,500	37,600	19,000	13,000	2,000	600	3,000	6,400
국 비									
도 비									
시 비	66,500	22,500	37,600	19,000	13,000	2,000	600	3,000	6,400
민 자									

문제점 및 대책

- 국유지 유상매입 및 용역 발주계획 변경에 따른 지연

□ 현황사진



□ 기대효과

- 시가지와 연계되는 도시숲길 조성
- 황성공원, 도시바람숲길 등 주변 공원 녹지를 연계할 수 있는 녹지 거점 형성

□ 담당자 현황

주관부서 (팀)	철도도심 재생과 (폐철도정비팀)	부서장	양현두	연락처	054-760-2289
		팀 장	김수현		
		담당자	윤태연		

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	주진계획													
				2022		2023		2024		2025		2026		임기 후			
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	
48	동천~황성 천년숲길 조성	2028	지자체														

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경주시	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 공원 현황상 시설 및 세부시설 등의 법적기준을 초과함에 따라 시설 유지관리, 보수 등의 어려움 발생
- 주민의식조사결과 참여자 대부분이 황성공원 원형찾기 및 휴식공간 확충 등 전체적인 재정비 필요성을 인식

□ 정책목표

- 2030년을 목표로 공원녹지를 체계적으로 구성하는 2030년 경주 공원녹지기본계획(2021. 10.)을 반영하여 상위계획과의 정합성 유지
 - 공원기능을 분리하고 황성공원의 원활한 기능수행과 효율적인 토지 이용 도모를 위한 공원조성계획 수립
- [근린공원 ⇒ 근린공원(고성숲 원형복원) + 문화공원(복합문화공간)]

□ 사업개요

- 위 치 : 황성공원 전역(895,373㎡)
- 사업기간 : 2020 ~ 2029년(10년간)
- 총사업비 : 535억원(공사비) * 공원조성계획(투자계획) 기준
- 사업내용
 - 도시관리계획(근린공원, 문화공원) 결정(변경)
 - 황성공원 조성계획(마스터플랜) 수립
 - 복합문화도서관(가칭) 사업계획 반영 (부지 30,000㎡)
 - 공원시설·교통처리 및 동선계획·식재계획 등 재검토
 - 공원조성계획에 따른 정비사업 시행
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표 : 연차별 추진계획에 따른 사업 시행

추진실적 및 향후계획

- 2021. 10. : 공원녹지기본계획 승인(경상북도)
 - 2022. 1. ~ 2023. 4. : 공원조성계획(안) 작성, 전문가자문회의 개최
 - 2023. 6. ~ 7. : 주민·시의회 의견청취, 주민설명회 개최
 - 2023. 8. ~ 10. : 관련부서(기관) 협의 및 市도시계획위원회 심의
 - 2023. 11. ~ 12. : 도시관리계획 경상북도 승인신청,
 - 2024. 1. ~ 5. : 道관련부서 협의·도시계획위원회 심의, 결정고시
 - 2024. 6. ~ : 정비사업 연차별 시행
- ※ 2021.부터 조기정비를 위한 철거공사 시행 및 화초(코스모스) 파종 추진중

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
공원조성계획 수립 및 승인				
		황성공원 정비사업 연차별 시행		

- 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후	
			계	2022	2023	2024	2025		2026
시 비	53,500	200	30,400	200	200	10,000	10,000	10,000	22,900

기대효과

- 황성공원의 원활한 기능 수행과 효율적인 토지이용 도모
- 본연의 황성공원 조성으로 시민건강 증진 및 새로운 관광명소로 지역경제 활성화에 이바지

담당자 현황

주관부서 (팀)	도시공원과 (공원조성팀)	부서장	정경자	연락처	054-779-8787
		팀 장	김연수		
		담당자	김민호		

공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획																	
				2022		2023			2024				2025				2026		임기 후		
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1		2	
49	황성공원 원형복원	2029	지자체	■																	

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
신규	예산	임기내	경주시	■해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 왕경숲을 조성하여 찬란한 문화유적과 아름다운 숲이 어우러진 고도 경관 조성

정책목표

- 왕경숲 조성을 통한 고도 경주의 정체성을 추구하는 경관 창출
- 단절된 녹지 네트워크를 유기적으로 연결하여 보문관광단지 관문으로 새로운 녹지공간 창출 및 도로 경관 개선

사업개요

- 위치 : 구황동 271번지 일원 (3차 29,751㎡, 4차 35,170㎡)
- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 총사업비 : 140억원
- 사업내용
 - 왕경숲 조성 실시설계 및 관련부서협의
 - 왕경숲 3차·4차부지 매입
 - 왕경숲 조성 공사시행 및 준공
- 사업주체 : 경주시

사업별 확인지표 : 연차별 추진계획에 따른 사업 시행

향후계획

- 2023. ~ 2024. : 실시설계(관련부서협의) 및 감정평가·토지보상협의
- 2024. ~ 2025. : 토지보상 및 공사착공
- 2026. : 공사 준공

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
-	실시설계 용역 시행, 토지보상	토지보상	공사착공	공사준공

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	입기전	입 기 내						입기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	14,000		14,000		340	5,900	5,760	2,000	
국 비						700	800		
도 비						210	240		
시 비	14,000		14,000		340	4,990	4,720	2,000	

□ 문제점 및 대책

- 주요 문화재 인접지역으로 문화재 조사 등 사업기간 장기화 우려
- 문화재 관련 허가 절차 사전 이행 등으로 사업기간 단축
- 사유지 조속한 매입으로 민원 발생 최소화

□ 현황사진

3차 부지 위치도	4차 부지 위치도

□ 기대효과

- 왕경숲 주변 뛰어난 자연·역사·문화를 함께 느낄 수 있는 복합공원 조성으로 공공의 복리 증진
- 도시 외곽 숲 조성을 통한 도시생태계의 건전성 확보 및 미세먼지 저감·폭염 완화 등으로 생활환경 개선

□ 담당자 현황

주관부서 (팀)	도시공원과 (공원조성팀)	부서장	정경자	연락처	054-779-8789
		팀 장	김연수		
		담당자	조진훈		

□ 공약로드맵

[법례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획												입기 후	
				2022		2023		2024		2025		2026					
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
50	보문 왕경숲 조성	2026	지자체	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

친환경 자동차 보급 등 탄소제로 친환경 교통도시 2030 플랜

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 친환경 교통도시 조성으로 쾌적한 환경 조성
- 친환경 자동차 인프라 구축으로 관광 활성화 도모

정책목표

- 관내 노후경유차에 대하여 조기폐차 및 매연저감장치 부착유도
- 관내 친환경 자동차(전기차, 수소차) 운행 비중 확대

사업개요

- 위 치 : 경주시 관내
- 사업기간 : 2022년 ~ 2030년
- 총사업비 : 199,800백만원
- 사업내용
 - 친환경자동차 충전인프라 구축
 - 친환경자동차(전기차, 수소차)구매 보조금 지급
 - 운행경유차 배출저감사업(조기폐차) 및 DPF(매연저감장치) 부착사업
 - 어린이 통학차량 LPG차 전환지원
- 사업주체 : 경주시

사업별 확인지표

- 전기차 및 수소차 보급 및 충전 인프라 구축
- 노후경유차 조기폐차 및 매연저감장치 부착
- 어린이 통학차량 LPG차 전환

향후계획

- 전기차 보급률 향상을 위한 전기차충전인프라 구축에 노력
- 노후경유차 조기폐차 및 매연저감장치 부착 확대 추진

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

〈단위 : 백만원〉

2022	2023	2024	2025	2026
9,800	15,000	15,000	15,000	15,000

- 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	199,800		69,800	9,800	15,000	15,000	15,000	15,000	130,000
국 비	119,880		41,880	5,880	9,000	9,000	9,000	9,000	78,000
도 비	25,974		9,074	1,274	1,950	1,950	1,950	1,950	16,900
시 비	53,946		18,846	2,646	4,050	4,050	4,050	4,050	35,100
민 자									

기대효과

- 친환경 자동차 인프라 구축으로 친환경자동차 이용시민 및 관광객 편의 증진
- 쾌적한 역사문화도시 및 탄소제로 도시 조성

담당자 현황

주관부서 (팀)	환경정책과 (기후변화 대응팀)	부서장	김홍근	연락처	054-779-6383
		팀 장	정수지		
		담당자	이영빈 배정민 진현범	054-779-6384	054-779-6386

공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획														
				2022		2023			2024				2025			2026		임기 후
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			
51	친환경 자동차 보급 등 탄소제로 친환경 교통도시 2030 플랜	2030	지자체															

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 현재 과잉공급 상태인 우리 지역의 택시면허 수를 감하여 종사자 소득 증대는 물론 택시산업 활성화 및 서비스 품질향상에 기여

□ 정책목표

- 과잉공급된 택시면허 수를 감하여 종사자 소득증대
- 택시산업 활성화 및 서비스 품질향상에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2029년(10년간)
- 총사업비 : '22 예산 25.96억원(국 1.716, 도 1,2012, 시 18.1428, 감차재단 4.9)
'23 예산 5.72억원(국 0.507, 도 0.3549, 시 3.55810, 감차재단 1.3)
'24 예산 15.04억원(국 0.78, 도 0.546, 시 11.414, 감차재단 2.3)
- 사업내용
 - 현재 과잉공급 상태인 우리 지역의 택시면허 수를 감하여 종사자 소득 증대는 물론 택시산업 활성화 및 서비스 품질향상에 기여
 - 2019년 총량산정에 따라 10년간 559대 감차 추진
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표 : 감차 대수

□ 향후계획

- 2022. 6. ~ 7. : 2022년 1차 감차 추진(법인 18대, 개인 6대)
- 2022. 9. ~ 10. : 2022년 2차 감차 추진(법인 26대)
- 2023. 3. ~ 6. : 2023년 감차 추진(법인 13대)

□ 연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
50대(법인44대, 개인6대) 감차 완료	13대(법인) 감차 추진	택시총량 산정, 예산 확보 및 감차 완료	예산 확보 및 감차 완료	예산 확보 및 감차 완료

○ 예산확보 계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	임기전	임기내					임기후
			계	2022	2023	2024	2025	
계	7,752	3,080	4,672	2,596	572	1,504		
국비	390	89.7	300.3	171.6	50.7	78		
도비	210.21	-	210.21	120.12	35.49	54.6		
시비	5,561.79	2,290.3	3,271.49	1,774.28	355.81	1,141.4		
민자	1,590	700	890	530	130	230		

□ 기대효과

- 과잉공급된 택시면허 수를 감하여 종사자 소득증대
- 택시산업 활성화 및 서비스 품질향상에 기여

□ 담당자 현황

주관부서 (팀)	교통행정과 (교통행정팀)	부서장	박대동	연락처	054-779-6522
		팀장	김규완		
		담당자	박유연		

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약번호	공약명	완료시기	사업구분	추진계획																
				2022		2023				2024				2025				2026		임기후
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
52	과잉공급 택시 감차 추진	2029	국책																	

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 경주시 지방상수도 운영 및 관리 효율화를 통한 경영수지 개선으로 수도 사업 선순환 구조 구축

정책목표

- 블록 및 유지관리시스템 도입을 통해 체계적·효율적인 관리관망체계 구축
- 사업대상지 내 노후 상수관로 개체 및 유수율 85% 달성을 통한 예산절감

사업개요

- 위 치 : 경주시 전역
- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년 (8년간)
- 총사업비 : 636억원(국비 337.2, 도비 82.4, 시비 216.8)
- 사업내용 : (경주시전역)블록시스템 및 유지관리시스템 구축 1식,
(탑동중블럭)노후 상수도 개체 69km 및 유수율 85% 달성
- 사업주체 : 경주시, 한국수자원공사(공기관대행)

사업별 성과지표 : 탑동중블록 유수율 85% 달성(성과심사 통과)

향후계획

- 2025. 12. : 유지관리시스템 구축 준공
- 2026. 5. : 노후관망 정비공사 완료
- 2026. 6. : 사업 성과판정 착수
- 2026. 12. : 사업 성과심사 완료 및 인계

연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
블록시스템 구축	노후상수관로개체 (긴급관망)	노후상수관로개체 (본공사)	유지관리시스템 구축	성과심사 및 사업완료

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구분	총사업비	입기전	입기내						입기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	63,647	32,882	30,765	15,207	7,046	8,512			
국비	33,723	15,600	18,123	9,124	4,900	4,099			
도비	8,240	5,185	3,055	1,825	644	586			
시비	21,684	12,097	9,587	4,258	1,502	3,827			
민자									

문제점 및 대책

○ 문화재 시·발굴 등 문화재 관련 법률절차 이행에 따른 사업지연 우려

기대효과

○ 경주 시민들에게 맑고 안정된 수돗물 공급

○ 수돗물 생산원가 절감으로 공기업 경영합리화 기여

담당자 현황

주관부서 (팀)	상수도과 (누수방지팀)	부서장	김영기	연락처	054-760-7851
		팀장	이상완		
		담당자	임대근		

공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획														
				2023				2024				2025				2026		입기후
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
53-1	노후 상수도 정비	2026	국책	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
신규	예산	임기내	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 하수관거 기술진단 및 정밀조사 결과에 따른 노후관 정비
- 외부유입수 저감으로 하수처리운영 효율화 및 처리장 증설요인 억제

정책목표

- 하수관거 정비를 통해 오수역류 및 악취방지로 생활권 개선

사업개요

- 위 치 : 시가지 내 총 7개지구(북군, 동천, 성건, 충효, 용강, 황오, 황남)
- 사업기간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 82억원(국비 49.2, 시비 32.8)
- 사업내용 : 노후하수관 개체 8.5km
- 사업주체 : 경주시

사업별 성과지표 : 노후하수관 개체 8.5km

향후계획

- 2024. 12. : 잔여구간(6.8km) 실시설계 완료
- 2025. 3. : 사전 행정절차(재원협의등) 완료 및 공사 총괄발주

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획


2022	2023	2024	2025	2026
1.2km 개체완료	0.5km 개체완료, 6.8km 실시설계	실시설계완료	공사착공	사업완료

○ 예산확보 계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	임기전	임 기 내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	8,200		8,200	1,300	309	757	2,917	2,917	
국 비	4,920		4,920		187	454	2,140	2,139	
도 비									
시 비	3,280		3,280	1,300	122	303	777	778	
민 자									

□ 현황사진

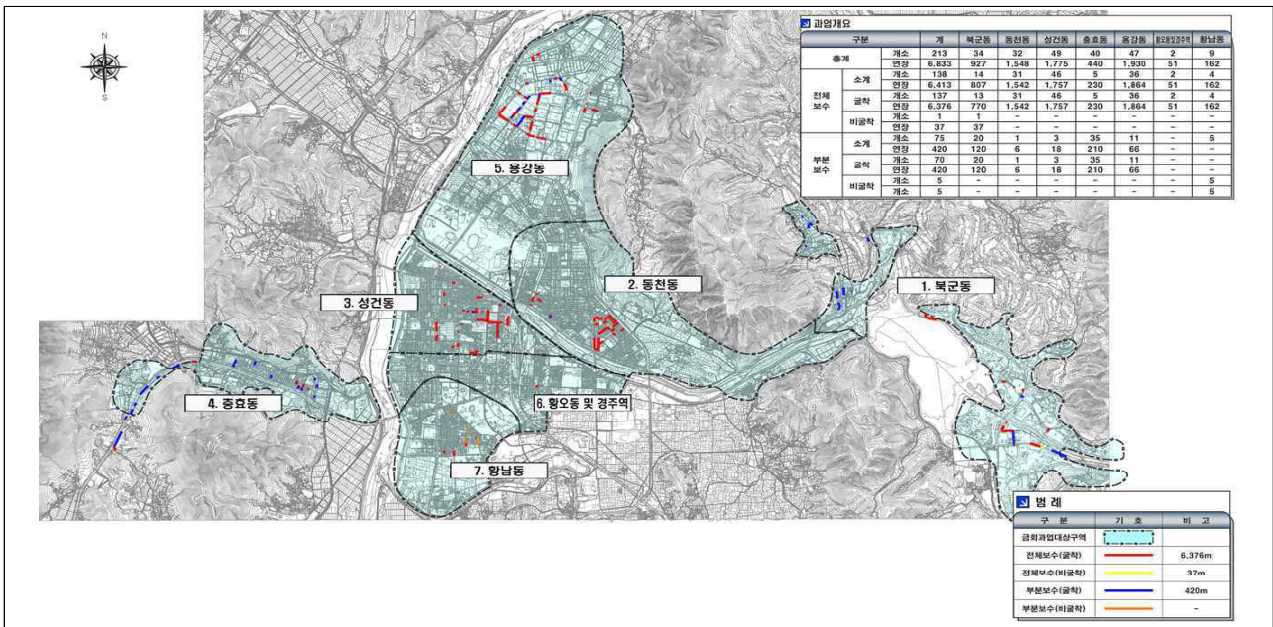

□ 담당자 현황

주관부서 (팀)	생활하수과 (하수정비팀)	부서장	류시출	연락처	054-779-8811
		팀 장	최중한		
		담당자	김윤정		

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획														임기 후	
				2022		2023			2024				2025				2026		
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
53-2	노후 하수관거 정비	2026	국책	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기후	경주시	<input type="checkbox"/> 해당없음 도움필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)

- 농어촌 지역(산내면, 내남면, 동해안지역 등) 광역, 지방상수도 확대 보급으로 균등한 물복지 실현

□ 정책목표

- 수원이 지하·지표수인 소규모 수도시설 이용하고 있는 농어촌지역의 수질오염으로 주민불편 해결
- 산내, 내남, 동해안지역 등 농어촌 원거리 - 약 5,000명 보급

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 일원(산내면, 내남면, 감포읍, 문무대왕면, 양남면 일원)
- 사업기간 : 2017 ~ 2027년(11년간)
- 총사업비 : 555억원(국비 299, 도비 36, 시비 220)
- 사업내용
 - 산내면 상수도 확충사업
 - 사 업 비 : 416억원(국280, 도36, 시100)
 - 사업기간 : 2017년 ~ 2027년
 - 사업내용 : 관로 100km, 가압장 23개소, 배수지 1개소 등
 - 내남면 상수도 확충(상신, 박달, 안심리)
 - 사 업 비 : 56억원(전액시비)
 - 사업기간 : 2020년 ~ 2026년
 - 사업내용 : 관로 16km, 가압장 6개소

- 동해안지역 상수도 확충사업(문무대왕: 구길, 용당, 봉길/ 감포: 대본2, 대본3)
 - 사 업 비 : 27.8억원(국19.5, 시8.3)
 - 사업기간 : 2021년 ~ 2024년
 - 사업내용 : 관로 6.3km
- 양남면 급수구역 확장공사(하서리~효동리)
 - 사 업 비 : 45억원(전액시비)
 - 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
 - 사업내용 : 관로 12km, 가압장 5개소
- 문무대왕면 호암리 급수구역 확장공사
 - 사 업 비 : 11억원(전액시비)
 - 사업기간 : 2021년 ~ 2026년
 - 사업내용 : 관로 4.4km, 가압장 1개소

사업별 성과지표 : 상수도 보급확대(관로매설 등)

향후계획

- 2026. 12. : (내남면, 양남면, 문무대왕면) 상수도 확충사업 준공
- 2027. 5. : (산내면) 상수도 확충사업 준공

연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026	2027
공사추진	공사추진	공사추진 (산내면) 준공(동해안)	공사추진 (산내면, 내남면, 양남면, 문무대왕면)	준공 (내남면, 양남면, 문무대왕면) 공사추진(산내면)	준공 (산내면)

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	55,568	13,608	35,880	6,671	7,467	5,942	8,900	6,900	6,080
국 비	29,942	6,800	18,860	2,640	2,300	1,920	7,000	5,000	4,282
도 비	3,598	769	2,106	275	103	228	900	600	723
시 비	22,028	6,039	14,914	3,756	5,064	3,794	1,000	1,300	1,075
민 자									

□ 문제점 및 대책

- 대규모 전환군특 예산확보 불확실성과 열악한 공기업회계 재정사항으로 사업비 확보 애로
- 국·도비 확보 활동강화, 일반회계 지원 등 예산확보 강화로 조기준공 도모

□ 기대효과

- 양질의 수돗물을 안정적으로 공급하여 시민들의 삶의 질 향상
- 원거리 지역 균등한 물 복지 실현

□ 담당자 현황

주관부서 (팀)	상수도과 (시설팀)	부서장	김영기	연락처	054-760-7832
		팀 장	이재수		
		담당자	장운필		

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획														임기 후		
				2022		2023				2024				2025					2026	
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
54	(광역)상수도보급확대 (내남, 산내 등)	2027	지자체	■														■		

형산강(황성, 용강), 신당천, 남천, 모화천 등 하천둔치 조성

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	■ 해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 둔치, 공원 및 산책로 조성 등 친수공간을 제공하여 지역주민들의 여가활동 및 힐링 공간으로 활용하고, 새로운 수변문화 힐링로드 및 관광명소 조성

□ 정책목표

- 하천둔치 조성으로 지역주민들에게 친수공간을 제공하여 삶의 질 향상과 경주시의 관광명소 조성

□ 사업개요

[형산강(황성, 용강)]

- 국가하천 구역 내 지역으로 주민 의견 수렴 후 하천관리청인 낙동강 유역환경청에 건의 예정(서천 ~ 에일린의뜰 둔치 준공 : ' 21.12.)

[신당천]

- 둔치 등 친수환경조성은 현재 시행 중인 재해예방사업 완료 후 추진 계획(준공예정일 : ' 24.12.)

[남천] (사업시행 중)

- 위 치 : 경주시 형산강 합류부 ~ 교촌교(남천)
- 사업기간 : 2018 ~ 2023 (5년간)
- 총사업비 : 20억원(시비)
- 사업내용 : 둔치·산책로 정비 L=1.7km, 쉼터·운동시설 등 편의시설 설치

[모화천] (사업시행 중)

- 위 치 : 경주시 외동읍 모화리 일원(모화소하천)
- 사업기간 : 2019 ~ 2024 (6년간)
- 총사업비 : 30억원(시비)
- 사업내용 : 둔치 및 산책로 조성 2.1km, 쉼터 운동시설 등 편의시설 설치

□ 사업별 확인지표 : 하천 둔치 조성

□ 향후계획

[형산강(황성, 용강)]

- 주민 의견 수렴 및 낙동강환경유역청 건의

[신당천]

- 신당천 하천재해 예방사업 완료 후 추진 계획

[남천]

- 2022. 12. : 2차분 공사 준공 (오릉교 ~ 문천교)
※ 2022. 06. : 1차분 공사 준공 (형산강 합류부 ~ 오릉교)
- 2023. 1. : 3차분 공사 착공 (문천교 ~ 교촌교)
- 2023. 12. : 전체 공사 준공

[모화천]

- 2022. 7. : 2차분 공사 예산 확보
※ 2022. 07. : 1차분 공사 준공 (동천합류부 ~ 부영아파트)
- 2022. 8. : 2차분 공사 착공
- 2022. 12. : 2차분 공사 준공(부영아파트 ~ 계동교)
※ 계동교 상류부 : 철도 철거 이후 시행 예정

□ 연차별 추진계획

○ 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
[남천] · 1차분 공사 준공 (형산강 합류부 ~ 오릉교) · 2차분 공사 준공 (오릉교~문천교) [모화천] · 1차분 공사 준공 (동천 합류부 ~ 부영아파트) · 2차분 공사 준공 (부영아파트 ~ 계동교)	[남천] · 3차분 공사 착공 (문천교~교촌교) · 전체 사업 준공 [모화천] · 계동교 상류부 : 철도 철거 이후 시행 계획			

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내					임기후
			계	2022	2023	2024	2025	
계	7,000	1,600	5,400	900	1,500	1,000	1,000	1,000
국 비								
도 비								
시 비	7,000	1,600	5,400	900	1,500	1,000	1,000	1,000
민 자								

□ 위치도 및 현황사진

[남천]

위 치 도	현 장 사 진

신규여부	예산구분	완료시기	사업주체	중앙정부 도움필요성
계속	예산	임기내	경주시	■ 해당없음 도움필요(□제도 □재정 □권한)

- 저수지의 아름다운 경관을 이용하여 둘레길 조성
- 지역주민 휴식공간 제공 및 관광자원 개발

□ 정책목표

- 저수지의 아름다운 경관을 이용하여 둘레길을 조성함으로써 관광 명소 발굴 및 지역주민 휴식공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 경주시 서면, 용강동, 천북면, 불국동
- 사업기간 : 2019 ~ 2025년
- 총사업비 : 10,450백만원
- 사업내용 : 저수지 둘레길 조성(심곡지, 구곡지, 성지지, 하동지)
- 사업주체 : 경주시

□ 사업별 확인지표 : 저수지 둘레길 조성

□ 향후계획

- 예산 확보 후 공사 시행
- 한국농어촌공사와의 원만한 협의를 통한 연차적 사업 추진

□ 연차별 추진계획

- 연도별 사업계획

2022	2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> • 예산확보 • 구곡지 착공 • 성지지 용역 	<ul style="list-style-type: none"> • 예산확보 • 심곡지(2차분) 공사착공 • 구곡지 공원조성 준공 • 하동지 착공 • 성지지 착공 	<ul style="list-style-type: none"> • 예산확보 • 심곡지(2차분) 공사준공 • 심곡지(3차분) 공사착공 • 구곡지 주차장 준공 • 하동지 준공 • 성지지 준공 	<ul style="list-style-type: none"> • 심곡지(3차분) 공사준공 	-

○ 예산확보 계획

〈단위 : 백만원〉

구 분	총사업비	임기전	임 기 내						임기후
			계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	10,450	4,500	5,950	1,650	1,800	2,500	0		
국 비	0	0	0	0	0	0	0		
도 비	300	0	300	300	0	0	0		
시 비	10,150	4,500	5,650	1,350	1,800	2,500	0		
민 자	0	0	0	0	0	0	0		

□ 문제점 및 대책

- 심곡지, 성지지, 하동지는 한국농어촌공사 관리 저수지로 우리시에서 둘레길 조성 시 매년 사용료를 지불해야 함

□ 현황사진



□ 기대효과

- 명품 둘레길 조성으로 관광자원 개발 및 지역균형개발 촉진

□ 담당자 현황

주관부서 (팀)	건설과 (농촌개발팀)	부서장	김철우	연락처	054-779-6410
		팀장	황정우		
		담당자	황재인		

□ 공약로드맵

[범례 : 계획수립 ■ 사업추진(지속) ■ 이행목표달성 ■]

공약 번호	공약명	완료 시기	사업 구분	추진계획													
				2022		2023		2024		2025		2026					
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
56	저수지 둘레길 조성사업	2025	지자체	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
